

Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana

Detalizētais projekta apraksts

Precizētā versija (2021.gada 21.februāris)

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Satura rādītājs

| | |
|---|-----------|
| Satura rādītājs | 2 |
| Projekta apraksts (kopsavilkums) | 3 |
| Termini un saīsinājumi | 6 |
| 1. Problēmas apraksts..... | 7 |
| 1.1. Projekta konteksts | 7 |
| 1.2. Esošā situācija un projekta ietvaros risināmās problēmas | 8 |
| 2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti | 12 |
| 2.1. Projekta mērķi..... | 12 |
| 2.2. Projekta rezultāta rādītāji | 14 |
| 2.3. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi | 14 |
| 3. Risinājuma apraksts | 16 |
| 3.1. Procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums | 17 |
| 3.1.1. Procesi un pakalpojumi | 17 |
| 3.1.2. Normatīvais regulējums | 20 |
| 3.2. Dati..... | 21 |
| 3.2.1. Atvērto datu kopas | 21 |
| 3.2.2. Ieslodzītā personas lieta | 22 |
| 3.2.3. Ar Ieslodzīto personu notikumiem saistītie kalendāri..... | 23 |
| 3.2.4. Vienotie klasifikatori un reģistri | 23 |
| 3.3. Programmatūra..... | 23 |
| 3.4. Infrastruktūra | 25 |
| 3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām | 25 |
| 4. Projekta ieguldījums SAM rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība | 27 |
| 4.1. Ieguldījums SAM rādītāju sasniegšanā..... | 27 |
| 4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums | 28 |
| 5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas | 30 |
| 5.1. Projekta darbības un to rezultāti | 30 |
| 5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks | 32 |
| 5.3. Projekta izmaksu sadalījums..... | 33 |
| 6. Projekta pārvaldība | 35 |

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi.

IeVP E-lietas programmas 1.posma ietvarā līdz 2021.gadam tiek plānots īstenot projektu "Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir ar IIS pilnveidošanas, attīstības un integrāciju palīdzību uzlabot IeVP efektivitāti un mazināt ar kriminālprocesa virzību un soda izciešanu saistīto dokumentu plūsmas laiku.

Projekta mērķi:

- M1: IeVP informācijas apmaiņas ar klientiem un institūcijām efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, elektronizējot dokumentu plūsmu.
- M2: Ieslodzītā personas lietas informācijas pieejamības nodrošināšana vienkopus elektroniskā vidē, pilnveidojot IIS un integrējoties ar E-lietas platformu.
- M3: Racionāla IKT pārvaldība, maksimāli izmantojot koplietošanas IKT risinājumus IIS attīstībā.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai:

Lai nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu, nepieciešams:

- izstrādāt tiešsaistes datu apmaiņas saskarni ar E-lietas koplietošanas komponentēm, datu nodošanai un saņemšanai no Tiesu informatīvās sistēmas, Probācijas klientu informācijas sistēmas un Prokuratūras informācijas sistēmas;
- veikt IIS tehnoloģiskos uzlabojumus un izstrādāt papildinājumus, lai nodrošinātu automatizētu datu apmaiņu ar Sodū reģistru, Adrešu reģistru, IR;
- veikt IIS funkcionālos papildinājumus, lai realizētu elektronisku informācijas nodošanu valsts institūcijām un pašvaldībām normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā;
- izstrādāt IIS sistēmas papildinājumus, kas ļaus IIS reģistrēt ieslodzīto personu iesniegumus un veikt pilnībā elektronisku šo dokumentu plūsmas apstrādi, kā arī nodrošinās iesnieguma elektroniskās kopijas pievienošanu ieslodzītās personas lietai;
- novērst IIS darbības nepilnības (aprēķinu kļūdu labojumi, sistēmas administrēšanas problēmu novēršana u.c.);
- izstrādāt Sistēmas papildinājumus:
 - realizēt informācijas ievades papildinājumus (esošo dokumentu kartiņu papildinājumi);
 - izstrādāt jaunas dokumentu (informācijas) ievades formas;
 - veikt Sistēmas lietojamības uzlabojumus (klasifikatori, reģistri, meklēšanas funkcijas uzlabojums);
 - papildināt esošās atskaites, izstrādāt jaunas t.sk. dinamiskās atskaites;
 - veikt dokumentu izdruku veidņu funkcionalitātes labojumus un papildinājumus;
- pilnveidot IIS funkcionalitāti, nodrošinot pilnīgu ieslodzītās personas lietas informācijas elektronisku pieejamību;

- pilnveidot IIS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai Datu publicēšanas platformā¹;
- Veikt paziņojumu un pieprasījumu sagatavošanas un nosūtīšanas procesa optimizāciju, lai IIS realizētu elektronisku informācijas nosūtīšanu valsts institūcijām un pašvaldībām likumdošanā noteiktos gadījumos un kārtībā.
- IIS pārcelt uz WEB vidi;
- Pilnveidot IIS, nodrošinot E-lietas koplietošanas komponentu izmantošanu (elektronisko lietu reģistru, koplietošanas klasifikatorus, koplietošanas reģistus, vienoto kalendāru u.c. funkcionalitāti)
- Iegādāties IIS darbināšanai nepieciešamās sērijveida programmatūras licences.

Projekta rezultāta rādītāji:

| # | Rezultāta rādītājs | Mērvienība | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām | Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām |
|---|---|------------|-------------------|---|---|
| 1 | Elektroniski apstrādāto dokumentu starp IIS un tieslietu nozares iestāžu informācijas sistēmām (TA, Prokuratūra, VPD) īpatsvars, izmantojot E-lietas platformu | % | 0 | 40 | 80 |
| 2 | Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās IeVP datu kopas | gab | 0 | 7 | 7 |
| 3 | Elektroniska informācijas par ieslodzītajām personām (lai sagatavotu ieslodzītos atbrīvošanai - atbilstoši likumdošanā noteiktajam) sagatavošana un nosūtīšana pašvaldībām un to iestādēm | % | 0 | 40 | 80 |

Projekta iznākuma rādītāji:

| # | Iznākuma rādītājs | Mērvienība | Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma) | Sasniedzamā vērtība projekta beigās |
|---|-----------------------------------|------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Pilnveidoti pamatdarbības procesi | skaits | 0 | 4 |
| 2 | Ieviesti e-pakalpojumi | skaits | 0 | 1 |

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 475 000 eiro, no tiem 403 750 eiro ir ERAF finansējums (85%) un 71 250 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums (15%). Projektu plānots īstenot 44 mēnešu laikā no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Projektam tika noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi:

¹ Datu publicēšanas platformu izstrādā VARAM kā centralizēto koplietošanas risinājumu.

1. Elektroniski apkopojot IeVP statistikas informāciju, samazināsies patērētais laiks, kuru IeVP darbinieki patērē statistikas pārskatu izstrādei. Īstenojot Projektu, tiek sagaidīts, ka IeVP darbiniekiem būs iespējams ietaupīt līdz pat 75% patērētā laika katra statistikas pārskata izveidei (1470 informācijas pieprasījumi gadā), gada ietvaros radot ieguvumu aptuveni 198 000 eiro apmērā, un Projekta pārskata periodā, t.i. līdz 2029. gadam, sniegs IeVP darbinieku resursu ietaupījumu aptuveni 1,3 milj. eiro (diskontētā vērtība) apmērā.
2. Digitalizējot nolēmumu saņemšanas plūsmu, tiks samazināts IeVP darbinieku patērētais laiks darbam ar nolēmumiem (aptuveni 10 000 nolēmumi gadā). Līdz šim papīra formātā saņemtie nolēmumi tika manuālā veidā reģistrēti IIS. Pēc Projekta ieviešanas nolēmumi no tiesām un citām tieslietu nozares iestādēm tiks saņemti elektroniski, ļaujot IeVP darbiniekiem līdz 75% samazināt nolēmumu reģistrēšanai patērēto laiku, kas gada ietvaros radīs ietaupījumu 32 000 eiro apmērā, Projekta pārskata periodā kopējais ieguvums IeVP sasniegs **214 000 eiro** (diskontētā vērtība).
3. Elektronizētas dokumentu plūsmas rezultātā IeVP darbiniekiem būs iespējams apstrādāt ieslodzīto personu un to radnieku iesniegumus elektroniski, ietaupot laiku, kuru pašlaik IeVP darbinieki pavadā papīra formāta iesniegumu apstrādei (24 200 iesniegumi gadā). Pēc Projekta ieviešanas paredzēts, ka IeVP darbinieki iesniegumus spēs izskatīt par apmēram 20% mazākā laikā, gada ietvaros radot 12 795 eiro ietaupījumu, kā rezultātā IeVP administratīvā sloga samazinājums Projekta pārskata periodā veido **85 000 eiro** (diskontētā vērtība).
4. Statistikas informācijas elektroniska apkopošana ļaus IeVP statistikas informācijas pieprasītājiem ietaupīt apmēram stundu gadā, iegūstot nepieciešamo informāciju elektroniski atkalizmantojamo datu veidā. Gada ietvaros tas radīs 6400 eiro ieguvumu, sabiedrībai, Projekta pārskata periodā, sniedzot **43 000 eiro** (diskontētā vērtība) ieguvumu.

Projekta īstenošanas rezultātā IeVP darbinieku darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, tāpēc projekta rezultātā nav paredzēts samazināt IeVP iestāžu darba vietas.

Termini un saīsinājumi

| Termins, saīsinājums | Skaidrojums |
|-----------------------------------|--|
| E-lietas koplietošanas komponente | Programmatūras komponente E-lietas platformā |
| E-lietas platforma | Programmatūras komponentu kopums, kas nodrošina E-lietas projektu programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu integrāciju |
| E-lietas programma | Saistītu projektu kopa izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidei, izmantojot mūsdienu IKT risinājumu piedāvātās iespējas |
| E-lietas publiskais portāls | Iedzīvotājiem un advokātiem paredzēta vide, kas nodrošina piekļuvi elektroniskajai lietai un ar tiesvedības procesiem saistītajiem e-pakalpojumiem |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| LRP jeb Prokuratūra | Latvijas Republikas Prokuratūra |
| IeVP, Pasūtītājs | Ieslodzījuma vietu pārvalde |
| IeVP IS vai IIS jeb Sistēma | Ieslodzījuma vietās esošo personu uzskaites valsts informācijas sistēma jeb Ieslodzīto informācijas sistēma |
| IKT | Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas |
| IR | Iedzīvotāju reģistrs (datu bāze) |
| ISAP | Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes (2014.–2020.gadam) |
| NAP | Nacionālais attīstības plāns (2014. – 2020. gadam) |
| PLUS | Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēma |
| Ieslodzītā persona, ieslodzītais | Uz izmeklēšanas laiku apcietināta vai ar brīvības atņemšanu notiesāta persona, kura atrodas attiecīgi izmeklēšanas cietumā vai brīvības atņemšanas iestādē |
| PLUS | Valsts probācijas dienesta Probācijas klientu uzskaites sistēma |
| ProIS | Prokuratūras informācijas sistēma |
| Projekts | Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošana |
| SAM | Specifiskais atbalsta mērķis |
| TA | Tiesu administrācija |
| TIS | Tiesu informatīvā sistēma |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VPD | Valsts Probācijas dienests |
| VRAA | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |


1. Problēmas apraksts

1.1. Projekta konteksts

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša tiesās pārvaldes iestāde, kas nodrošina apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi.

Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) šajā plānošanas periodā kā vienu no darbības prioritātēm ir izvirzījusi tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošanu un kapacitātes stiprināšanu, kas atbilst Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" mērķim Nr.1 - izveidot izcilu uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, ēnu ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, kā arī korupciju, nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, uzlabojot tieslietu sistēmas darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti.

Lai šis mērķis tiktu sasniegts, ir plānots realizēt projektu programmas "E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide" 1.posmu (turpmāk – E-lietas programmas 1.posms), kas tiks finansēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma Specifiskā atbalsta mērķa Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" ietvarā.

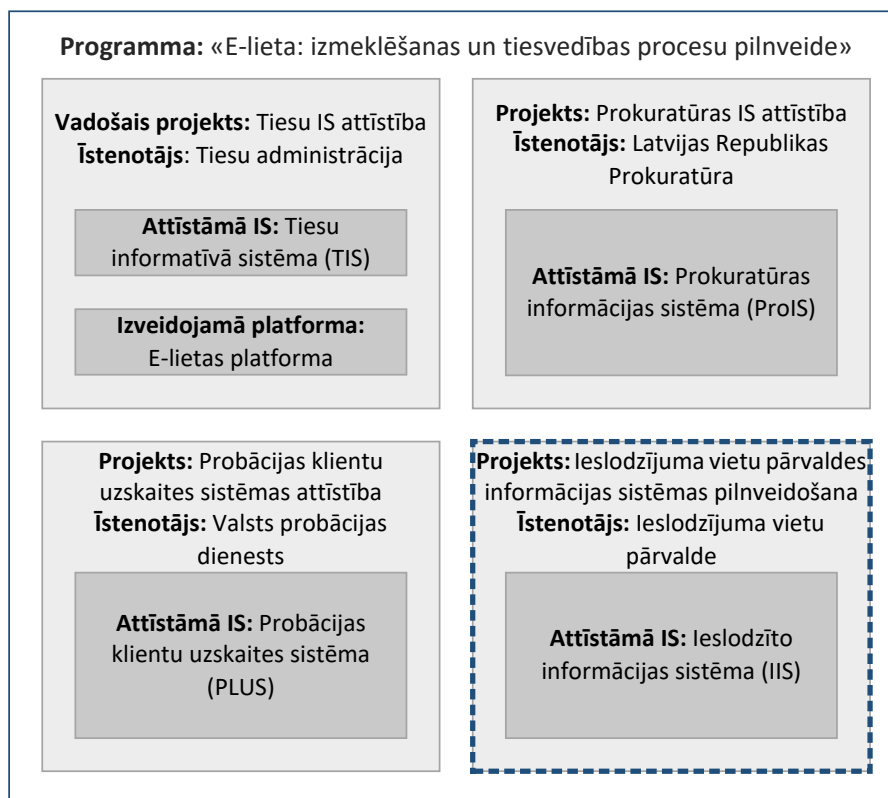

Attēls Nr. 1 E-lietas projektu programma

Tieslietu ministrija E-lietas programmas 1.posmā ir iekļāvusi 4 tieslietu nozares institūcijas un to pārziņā esošas valsts informācijas sistēmas institūciju darbības pilnveidošanas un kopdarbības izveides aktivitātēm:

- Tiesu IS attīstība;
- Prokuratūras IS attīstība;
- Probācijas klientu uzskaites sistēmas attīstība;

- IeVP informācijas sistēmas pilnveidošana.

IeVP E-lietas programmas 1.posmā līdz 2021.gadam tiek plānots īstenot projektu „Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana" (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir ar IIS pilnveidošanas, attīstības un integrāciju palīdzību uzlabot IeVP efektivitāti un mazināt ar kriminālprocesa virzību un soda izciešanu saistīto dokumentu plūsmas laiku.

1.2. Esošā situācija un projekta ietvaros risināmās problēmas

Šobrīd IeVP savas pamatdarbības nodrošināšanai izmanto valsts informācijas sistēmu - Ieslodzīto informācijas sistēma. IIS ir ieviesta IeVP un visās 9 ieslodzījuma vietās.

IIS izveidota 2011. gadā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0069 "Ieslodzīto informācijas sistēma" ietvaros, lai nodrošinātu:

- vienotu informācijas sistēmu, kas elektroniski apkopo visa veida informāciju par ieslodzījuma vietās esošajām personām,
- ieslodzījuma vietu darbiniekiem nepārtrauktu pieeju aktuālajai informācijai,
- informācijas apmaiņu ar citām valsts iestādēm, kurām šāda informācija ikdienā ir nepieciešama.

IIS apkopo plašu datu apjomu par visām personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās. Tā tika veidota, lai samazinātu papīra formāta dokumentu apstrādē patērētos personāla un tehniskos resursus, kā arī lai pilnvērtīgi izmantotu uzkrāto informāciju.

Liela daļa ieslodzītā lietā esošās informācijas jau tagad tiek reģistrēta digitāli IIS, tomēr joprojām par pamatu ieslodzījuma vietu pamatdarbības procesos tiek izmantota ieslodzītā lietas papīra versija. Atteikšanos no papīra lietas aizkavē IIS zemā uzticamība un fakts, ka krimināllietu nolēmumi no tiesām tiek saņemti papīra formā, kā arī normatīvais regulējums paredz, ka ieslodzītā personas apliecinātie dokumenti (ja tādi ir) ir daļa no ieslodzītā lietas, kas ir jāglabā aploksnē.


Kaut arī IIS šobrīd nav aizstājusi papīra dokumentu formā apkopoto informāciju par ieslodzīto personu, t.i. ieslodzītas personas lietu, tomēr tās izveide ir izmainījusi gan IeVP darbības procesu norises kārtību, gan arī radījusi priekšnosacījumus ieslodzītā personas lietas pilnīgai elektronizācijai.

Definējot Projekta tvērumu, tika noteiktas šādas Projekta ietvaros risināmās problēmas.

P1: Laikietilpīgi, neoptimāli IeVP pamatdarbības procesi, kas saistīti ar papīra dokumentu plūsmu un to apstrādi, kā arī sadarbība ar citām iestādēm.


Joprojām liels apjoms informācijas, kas skar ieslodzījuma vietu pamatdarbības nodrošināšanu un sadarbību ar citām institūcijām, tiek apstrādāts manuāli papīra dokumentu formā. Kaut arī IIS un/vai lietvedības sistēmā informācija tiek ievadīta, vairumā gadījumu darbs notiek ar papīra dokumentu oriģināliem. Piemēram:

- ieslodzītā personas lieta - izveide un uzturēšana tiek realizēta manuāli papīra dokumentu formā, papildus – IIS tiek ievadīti visi dati, ko ir iespējams par šo personu reģistrēt sistēmā;
- ieslodzīto personu iesniegumi - ieslodzītā persona ikvienu savu nepieciešamību pauž rakstiska iesnieguma formā, cietuma personāls to reģistrē un apstrādā, ievadot informāciju lietvedības sistēmā, kā arī papīra dokumentu nogādā izskatītājam un lēmuma pieņēmējam. 2015.gadā IeVP centrālais aparāts saņēma un izskatīja 5347 iesniegumus Administratīvā procesa likumā un Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā (sk. Attēls Nr. 2). Šobrīd iesnieguma izskatīšanas process ir resursu ietilpīgs, kā arī tiek patērēts resurss, dokumenta fiziskai pārvietošanai un uzglabāšanai;

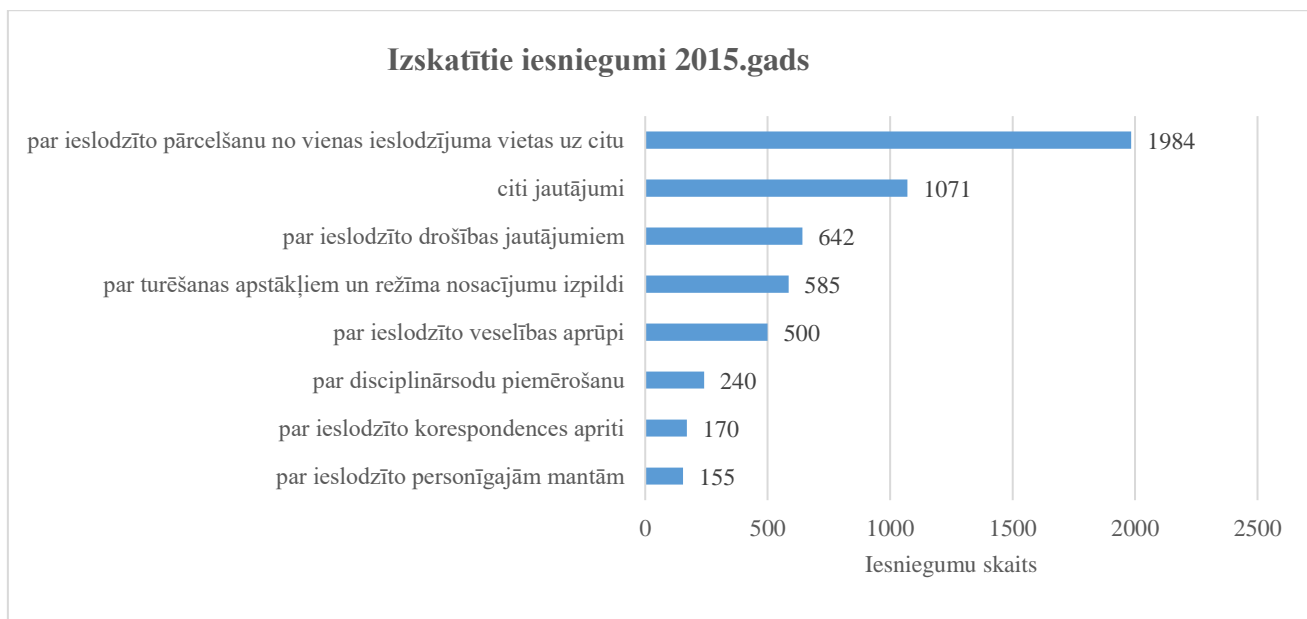

Attēls Nr. 2 Izskatīto ieslodzīto personu iesniegumu skaits 2015. gadā

- konvojēšanas pieprasījumi – no tiesas tiek saņemti pieprasījumi, informācija tiek ievadīta IIS, bet par pamatojumu reālām darbībām kalpo tomēr papīra dokuments vai izdruka, ja dokuments ir saņemts elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
- iepazīstināšana ar lietas materiāliem – ikvienai personai (apcietinātais, notiesātais), kas atrodas ieslodzījuma vietā, ir tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem, t.sk. apsūdzības rakstu. Gan pieprasījums, gan iepazīstināšana ar lietas materiāliem notiek papīra dokumentu veidā;
- informācijas pieprasījumi no prokuratūras, tiesas vai probācijas dienesta – izmeklēšanas, tiesvedības un soda izpildes procesos rodas dažāda veida jautājumi un ir nepieciešama informācijas precizēšana (piemēram, notiesāto izvērtēšanas ziņojumi, izziņas par soda izciešanas gaitu, gala termiņu noteikšanas precizēšana, jautājumi par īslaicīgās brīvības atņemšanas soda izpildi u.c.), kura šobrīd tiek realizēta vai nu apmainoties ar papīra dokumentiem, vai elektroniski radītiem un parakstītiem dokumentiem, izmantojot e-pastu.
- paziņojumu un pieprasījumu sagatavošana un nodošana valsts un pašvaldību institūcijām likumdošanā noteiktos gadījumos un kārtībā – 2015.gadā papīra formātā tika sagatavota un nosūtīta informācija (paziņojumi, pieprasījumi) - valsts policijai, bāriņtiesām, pašvaldībām (t.sk. pašvaldību sociālajiem dienestiem) kopā 4286 paziņojumi un pieprasījumi (sk. Attēls Nr. 3);

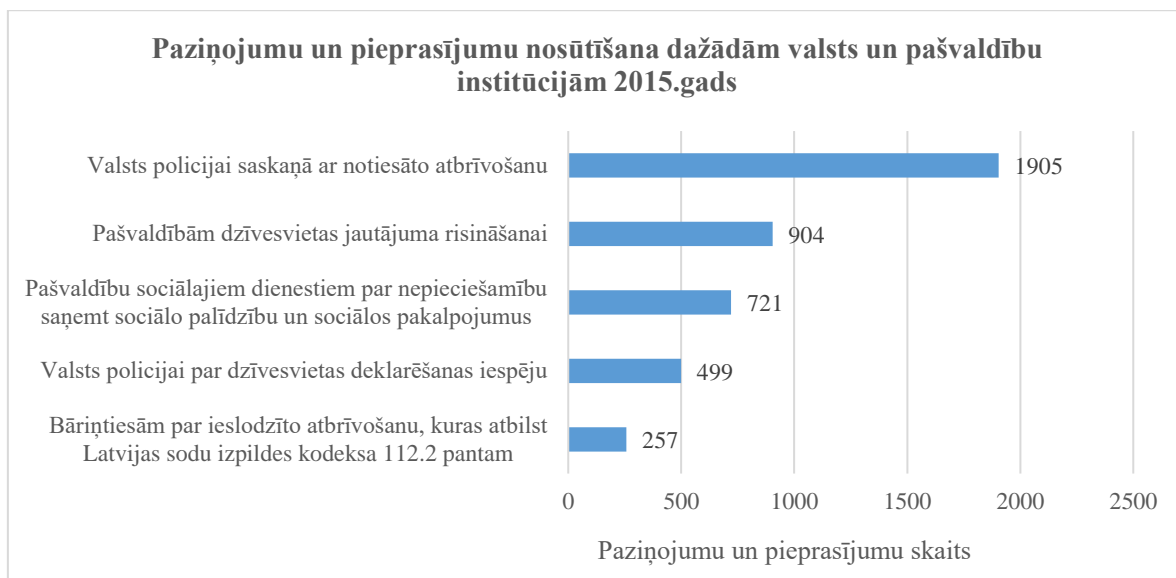

Attēls Nr. 3 Valsts un pašvaldību institūcijām nosūtīto paziņojumu un pieprasījumu skaits 2015. gadā

Plānotais IIS pilnveidošanas pasākumu kopums, ietverot gan IeVP darbības procesu pārskatīšanu un pielāgošanu pilnībā elektronizētai E-lietas dokumentu aprītei, kā arī IIS plānotie papildinājumi/ labojumi šī projekta ietvarā kompleksi risinās izvirzīto problēmu, uzlabojot IeVP pamatdarbības darbības procesus un pārvaldības efektivitāti.

P2: IIS datu integritātes problēmas (zema IIS datu ticamība)

IIS intensīvas izmantošanas laikā tika atklātas vairākas Sistēmas nepilnības, kuru novēršana nozīmīgi palielinās gan IIS datu ticamību, gan IIS izmantošanu, kā arī samazinās laiku, kas šobrīd tiek patērēts, lai uzturētu informāciju un realizētu aprēķinus, ko veic paralēli citā informācijas sistēmā vai papīra formā, aizstājot IIS neprecīzo informāciju un aprēķinu datus.

IIS uzskaites un aprēķinu kļūdas – daļai realizēto aprēķinu nav ņemti vērā visi informācijas par ieslodzīto personu ievades un pārvaldības realizācijas scenāriji, nav iekļauti visi notikumu gadījumi (piemēram, gadījumi, kad nepieciešams kombinēt vairāku piespriesto sodu veidus vai termiņus vienai personai, vai ja uz personu attiecas vairāki kriminālprocesi).

- IIS problēmas:
- tiesas nolēmumu un piespriesto sodu informācijas ievades un pārvaldības problēmas;
- nepareiza iepriekšējā apcietinājumā pavadītā laika aprēķināšana un nepareiza soda termiņa beigu aprēķināšana;
- ieslodzīto sodu izpildes termiņu kontroles nepilnības;
- ar brīvības atņemšanu saistīto sodu izciešanas režīmu uzskaites un vēsturisko datu ieguves problēmas;
- ieslodzīto personu izvietojuma atskaišu sagatavošanas nepilnības;
- pārvietošanas/konvojēšanas pieprasījumu sagatavošanas un konvojēšanas izpildes procesa uzskaites informācijas nepilnības;
- elektroniski sagatavotas informācijas/ dokumentu izdruku nepilnības.

Risinājums - IIS tiks veiktas izmaiņas un ieviesti papildinājumi, novēršot kļūdas un nepilnības un tādējādi paaugstinot datu kvalitāti, uzticēšanos Sistēmai un tās lietojamību, šādās funkcionalitātēs:

- Spriedumu vadība, ieslodzītai personai piespriesto sodu un ar brīvības atņemšanu saistīto termiņu un soda izciešanas režīmu aprēķini un pārvaldība;

- Ieslodzīto personu izvietošanas uzskaitē un pārvaldība;
- Pārvietošanas/konvojēšanas procesa vadība;
- IIS informācijas reģistrācijas kartiņu papildinājumi, dokumentu izdruku veidņu funkcionalitātes labojumi un papildinājumi, jaunu dokumentu veidņu izstrāde.

P3: IeVP darbības procesu atbalstam nepieciešamo dinamisko atskaišu trūkums, kā arī IeVP publiski pieejamo datu neesamība elektroniskā atkalizmantojamā formātā.

Šobrīd IeVP darbības procesu uzlabošanas iespējas ir ierobežotas, jo darbības analīze tiek veikta, pamatojoties un manuālu analītiskās informācijas sagatavošanu, kas ir laikietilpīgs process un tā rezultāts vairs var nebūt operatīvs. Izstrādājot un ieviešot operatīvo atskaišu sagatavošanu IIS, kā arī papildinot pamatdarbības procesus ar darbību izvērtēšanas aktivitātēm, tiks izveidota iespēja veikt IeVP darbības procesu pārskatīšanu un ar operatīvu informāciju pamatotu lēmumu pieņemšanu.

IIS izstrādājot publiski pieejamas depersonalizētus datus saturošas atskaites, kā arī realizējot to publiskošanu, sabiedrībai būs pieejami statistikas dati, kas saistīti ar ieslodzījuma vietu darbību un informāciju par ieslodzījuma vietās esošām personām.

P4: IIS lokālā aplikācija nenodrošina attālinātas piekļuves iespēju, kā arī ir zems un esošai situācijai nepietiekams IIS integrācijas līmenis ar citām informācijas sistēmām.

Kaut arī IIS izstrādes laikā sākotnēji tika plānota pilnvērtīga un visaptveroša informācijas apmaiņa ar citām valsts iestādēm (to informācijas sistēmām), kurām šāda informācija ikdienā ir nepieciešama, tomēr praksē ir realizēta datu apmaiņa, kas nav pietiekama, lai nodrošinātu automātiskus datu apmaiņas pieprasījumus ar TIS, ProIS un PLUS, kā arī citām sistēmām.

IIS pārceļšana uz WEB balstītām tehnoloģijām nodrošinās attālinātas piekļuves iespējas, ļaus izveidot vienotu centralizētu Sistēmu, optimizēt Sistēmas uzturēšanu, pilnveidot tās drošību, ka arī izpildīs priekšnosacījumu, lai IIS varētu realizēt automātiskas integrācijas un veidot kopdarbību ar citām informācijas sistēmām.

P5: Ar tiesvedības procesu norisēm saistīto notikumu un tajos iesaistīto IeVP resursu neelastīga plānošana un IeVP neoptimāla resursu un ar ieslodzītajām personām saistīto notikumu pārvaldība.

Šobrīd informācija par ieslodzītās personas pieejamību netiek uzturēta elektroniskā formā, kas ierobežo iespējas efektīvi plānot ieslodzīto konvojēšanu uz tiesas sēdēm vai attālinātas dalības tiesas sēdē nodrošināšanu videokonferences režīmā. Kaut gan tiesas sēžu kalendāri tiek uzturēti elektroniskā formā, tie nav integrēti ar citu institūciju (t.sk. IeVP) informācijas sistēmām, līdz ar to tiesvedības procesos iesaistīto institūciju līdzdalība joprojām tiek plānota manuāli, izmaiņu gadījumā pārplānošana ir smagnēja un laikietilpīga.

No 2014. gada IeVP ir pieejama fiziskā un tehniskā infrastruktūra, kas nodrošina ieslodzījuma vietās videokonferenču iespējas – visās 9 ieslodzījuma vietās ir izveidotas videokonferenču telpas, kas aprīkotas ar video konferenču un skaņas ieraksta iekārtām. Tomēr to izmantošana varētu tikt optimizēta, ja tiktu izveidota centralizēta elektronizēta šo resursu pārvaldība IeVP, kā arī radīta integrācija ar E-lietas platformu, kas realizēs ar izmeklēšanas un tiesvedības procesiem saistīto starp-institūciju notikumu plānošanu. Pašreiz tiesas sēžu un video konferenču kalendāri tiek uzturēti TIS. Šis modelis nav optimāls, jo TIS rīcībā nav informācijas par visu tiesvedības notikumam nepieciešamo resursu (personu, telpu, iekārtu, utt.) pieejamību.

2. Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti

2.1. Projekta mērķi

Projektā noteiktie mērķi iekļaujas kopējo E-lietas programmas 1.posma mērķu ietvarā un izriet no TM izvirzītajām darbības prioritātēm, kas atbilst NAP2020 definētajam rīcības virziena "Izcila uzņēmējdarbības vide" uzdevumam "Tiesu sistēmas efektivizācija" - tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošana un kapacitātes stiprināšana.

NAP izvirzīto mērķu sasniegšanai būtisks faktors ir IKT jomas attīstība valsts līmenī, kā arī aktīva sabiedrības iesaiste un līdzdalība tajā. Lai noteiktu rīcībpolitiku šajā jomā, VARAM vadībā ir izstrādāts vidēja termiņa plānošanas dokuments "Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam" (turpmāk –ISAP). Analizējot iepriekšējā plānošanas periodā sasniegtos rezultātus un iegūto pieredzi, tika noteikti 7 galvenie informācijas sabiedrības attīstības virzieni šim plānošanas periodam.

IIS pilnveidošanas un E-lietas programmas mērķi atbilst ISAP noteiktajiem rīcības virzieniem un plānotajām aktivitātēm:

- moderna un efektīva publiskā pārvalde:
 - publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija, iekļaujot procesu pārveidi, optimizāciju un elektronizāciju, kā arī sadarbību starp publiskās pārvaldes procesiem;
 - vienota publiskās pārvaldes datu telpa, kas paredz ikvienai pārvaldes iestādei pieejamību visai informācijai publiskās pārvaldes iestāžu ekosistēmā;
 - IKT infrastruktūras optimizācija.
- e-pakalpojumi un digitālais saturs sabiedrībai:
 - publiskās pārvaldes datu un transakciju pakalpojumu atvēršana citiem lietotājiem;
 - koplietošanas platformu un pakalpojumu attīstība publisko pakalpojumu sniegšanai;
- uzticēšanās un drošība:
 - uzticēšanās elektroniskajai videi.

IIS projekta mērķi ir definēti atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaram un 2015.gada 17.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" noteiktajam.

E-lietas programmai ir noteikti mērķi šādos rīcību virzienos:

- Dokumentu plūsmas elektronizācija;
- Pamatdarbības procesu pilnveidošana;
- Racionālā IKT pārvaldība.

Katra E-lietas programmas projekta mērķi ir definēti minētajos virzienos.

Projektam tiek izvirzīti šādi mērķi:

M1: IeVP informācijas apmaiņas ar klientiem un institūcijām efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, elektronizējot dokumentu plūsmu

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, nepieciešams:

- Izstrādāt tiešsaistes datu apmaiņas saskarni ar E-lietas koplietošanas komponentēm, datu nodošanai un saņemšanai no Tiesu informatīvās sistēmas, Probācijas klientu informācijas sistēmas un Prokuratūras informācijas sistēmas;
- Veikt IIS tehnoloģiskos uzlabojumus un izstrādāt papildinājumus, lai nodrošinātu automatizētu datu apmaiņu ar Sodū reģistru; Adrešu reģistru; IR u.c.
- Veikt IIS funkcionālos papildinājumus, lai realizētu elektronisku informācijas nodošanu valsts institūcijām un pašvaldībām normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā.
- Izstrādāt IIS sistēmas papildinājumus, kas ļaus IIS reģistrēt ieslodzīto personu iesniegumus un veikt pilnībā elektronisku šo dokumentu plūsmas apstrādi, kā arī nodrošinās iesnieguma elektroniskās kopijas pievienošanu ieslodzītās personas lietai, mazinot risku, ka iesnieguma izskatīšana netiek veikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā un Iesniegumu likumā noteiktai kārtībai.

M2: Ieslodzītā personas lietas informācijas pieejamības nodrošināšana vienkopus elektroniskā vidē, pilnveidojot IIS un integrējoties ar E-lietas platformu

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

- Novērst IIS darbības nepilnības (aprēķinu kļūdu labojumi, sistēmas administrēšanas problēmu novēršana),
- Izstrādāt Sistēmas papildinājumus:
 - realizēt informācijas ievades papildinājumus (esošo dokumentu kartiņu papildinājumi);
 - izstrādāt jaunas dokumentu (informācijas) ievades formas;
 - veikt Sistēmas lietojamības uzlabojumus (klasifikatori, reģistri, meklēšanas funkcijas uzlabojums);
 - papildināt esošās atskaites, izstrādāt jaunas t.sk. dinamiskās atskaites;
 - veikt dokumentu izdruku veidņu funkcionalitātes labojumus un papildinājumus.
- Pilnveidot IIS funkcionalitāti, nodrošinot ieslodzītās personas lietas informācijas elektronisku pieejamību, samazinot ieslodzītās personas lietas papīra formāta informācijas apriti;
- pilnveidot IIS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai Datu publicēšanas platformā²;
- Veikt paziņojumu un pieprasījumu sagatavošanas un nosūtīšanas procesa optimizāciju, lai IIS realizētu elektronisku informācijas nosūtīšanu valsts institūcijām un pašvaldībām likumdošanā noteiktos gadījumos un kārtībā.

² Datu publicēšanas platformu izstrādā VARAM kā centralizēto koplietošanas risinājumu.

M3: Racionāla informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldība, maksimāli izmantojot koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus IIS attīstībā

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

- IIS pārcelt uz WEB vidi;
- Pilnveidot IIS, nodrošinot E-lietas koplietošanas komponentu izmantošanu (elektronisko lietu reģistru, koplietošanas klasifikatorus, koplietošanas reģistus, vienoto kalendāru u.c. funkcionalitāti).

2.2. Projekta rezultāta rādītāji

Pēc projekta pabeigšanas tiek plānots sasniegt šādus projekta rezultāta rādītājus:

Tabula Nr. 1 Projekta rezultāta rādītāji

| | Rezultāta rādītājs | Mērvienība | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām | Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām |
|---|---|------------|-------------------|---|---|
| 1 | Elektroniski apstrādāto dokumentu starp IIS un tieslietu nozares iestāžu informācijas sistēmām (TA, Prokuratūra, VPD) īpatsvars, izmantojot E-lietas platformu | % | 0 | 40 | 80 |
| 2 | Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās IeVP datu kopas | gab | 0 | 7 | 7 |
| 3 | Elektroniska informācijas par ieslodzītajām personām (lai sagatavotu ieslodzītos atbrīvošanai - atbilstoši likumdošanā noteiktajam) sagatavošana un nosūtīšana pašvaldībām un to iestādēm | % | 0 | 40 | 80 |

2.3. Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi

Tabula Nr. 2 Rezultāta rādītāju sasniegšanas pasākumi

| Rezultāta rādītājs | Pasākuma apraksts |
|--|--|
| Elektroniski apstrādāto dokumentu starp IIS un tieslietu nozares iestāžu informācijas sistēmām (TA, Prokuratūra, VPD) īpatsvars, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes | Saistībā ar elektronizētu un automatizētu datu apmaiņu starp IIS un pārējām E-lietas programmā ietvertajām iestādēm un to informācijas sistēmām, precizējot izmantojamās datu kopas un datu apmaiņu, tiks veikti papildinājumi IeVP un sadarbības iestāžu regulējošajos normatīvajos aktos, kā arī E-lietas platformas izmantošanai tieslietu nozares līmenī TM tiks noteikta elektroniska dokumentu apmaiņa. E-lietas portālā tiks izvietota informācija par publiski pieejamo informāciju un publiskajiem pakalpojumiem. |
| Izplatīšanai sagatavotās un pieejamās IeVP datu kopas; | E-lietas portālā tiks izvietota informācija par publiski pieejamām datu kopām. |


| Rezultāta rādītājs | Pasākuma apraksts |
|--|--|
| Elektroniska informācijas par ieslodzītajām personām (lai sagatavotu ieslodzītos atbrīvošanai - atbilstoši likumdošanā noteiktajam) sagatavošana un nosūtīšana valsts un pašvaldību iestādēm | Pašvaldībām tiks izsūtīta informācija un uzaicinājums turpmākā sadarbībā ar IeVP izmantot elektroniskās saziņas kanālu, izmantojot e-adresi. |

3. Risinājuma apraksts

IIS pilnveidošanas projekta mērķu sasniegšanai tiks veiktas vairākas aktivitātes:

- IIS tiks pārcelta uz WEB balstītām tehnoloģijām;
- Tiks novērstas IIS esošās nepilnības;
- Tiks attīstītas dokumentu ievades/izveides ekrānformas;
- Tiks realizēti IIS papildinājumi integrācijai ar E-lietas platformu;
- Tiks veikta ieslodzīto personu un notikumu kalendāru izstrāde un integrācija ar E-lietas notikumu kalendāriem;
- Tiks veikti IIS papildinājumi, lai realizētu vienoto klasifikatoru un reģistru ieviešanu un izmantošanu;
- Tiks izstrādātas jaunas datu apmaiņas saskarnes un veikti esošo saskarņu papildinājumi;
- IIS tiks izveidotas iesniegumu izskatīšanas un citas informācijas sagatavošanas un nodošanas elektroniskas plūsmas.

Projekta ietvarā IIS pilnveidošana tiks veikta, ņemot vērā IIS integrāciju E-lietas loģiskajā arhitektūrā (sk. Attēls Nr. 4).

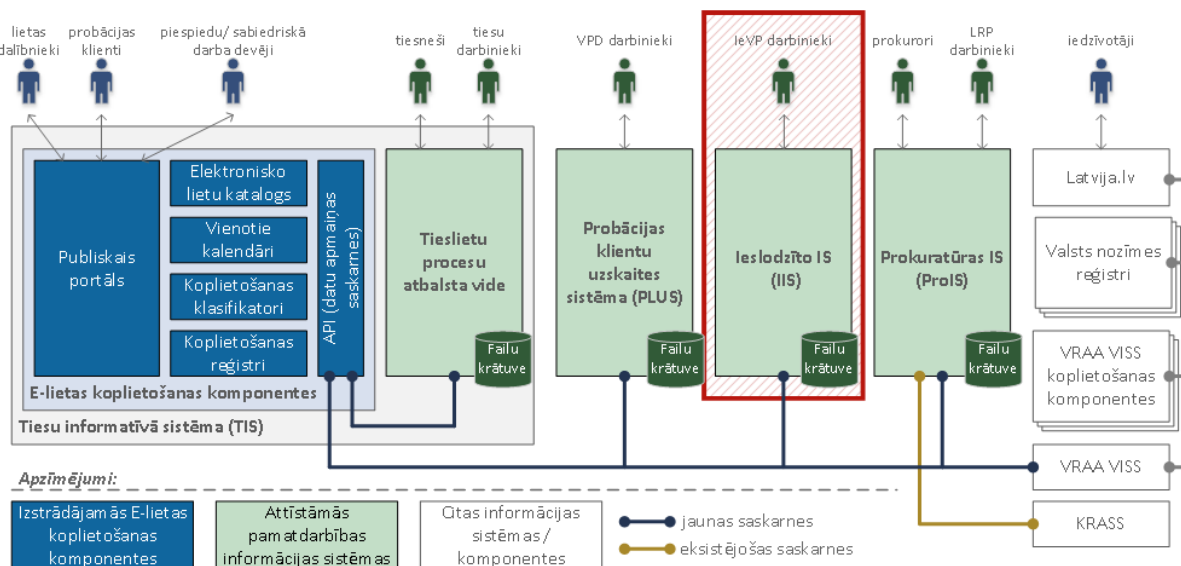

Attēls Nr. 4 IIS E-lietas loģiskās arhitektūras kontekstā

Tā kā IeVP ir viena no iestādēm, kas no TM puses ir iekļauta E-lietas programmas realizācijas 1.posma ietvarā, tas rada iespēju IeVP izmantot risinājumus, kas tiks realizēti pārējo 3 iesaistīto iestāžu IS pilnveidošanas/attīstības projektos. IeVP būs iespējams izmantot:

- dokumentu skenēšanas aplikāciju, kas tiks izstrādāta ProIS attīstības projektā un nodrošinās maksimāli vienkāršotu un automatizētu papīra dokumentu skenēšanu un pievienošanu IS ar vienkāršotu metadatu pievienošanas iespēju;
- procesuālo dokumentu veidlapu funkcionalitāti E-lietas publiskajā portālā, ko IeVP varētu nākotnē izmantot ieslodzīto personu iesniegumu digitālai radīšanai, procesā piedāvājot ieslodzītajām personām aizpildīt iesniegumus elektroniski (piemēram, izmantojot e-kiosku);
- lietas dalībnieku piekļuves nodrošināšana tiesvedības lietas datiem un materiāliem E-lietas publiskajā portālā;
- Video liecību un audio protokolu apskates risinājums.

3.1. Procesi, pakalpojumi un to normatīvais regulējums

IeVP funkcijas, uzdevumi un kompetence noteikti Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr. 827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums" otrajā sadaļā.

3.1.1. Procesi un pakalpojumi

IeVP funkcijas ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana, ko izpilda ieslodzījuma vietās.

IeVP veic pamatdarbības - apcietinājuma kā drošības līdzekļa piemērošanas apcietinātajām personām un brīvības atņemšanas izpildes notiesātajām personām - procesu vadību, koordināciju un atbalstu, tādejādi kopumā atbildot par pamatdarbības nodrošināšanu.

Realizējot pamatdarbības procesus, ieslodzījuma vietās tiek:

- veikta ieslodzījuma vietu apsardze;
- uzraudzīta un nodrošināta ieslodzītajām personām noteikto uzvedības normu un tiesību ievērošana, kā arī viņu pienākumu izpilde;
- ieslodzītajiem tiek sniegti normatīvajos aktos noteiktie sadzīves un komunālie pakalpojumi;
- nodrošināta ieslodzīto medicīniskā aprūpe;
- realizēti ieslodzīto garīgās aprūpes un audzināšanas pasākumi.

IeVP vadības un atbalsta procesi:

- stratēģiskā plānošana un vadība;
- personāla vadība un pārvaldība, t.sk. personāla profesionālā sagatavotībā un pilnveides izglītība;
- finanšu pārvaldība, t.sk., ieslodzīto personu finanšu pārvaldība;
- informācijas un komunikācijas vadība;
- lietvedība, t.sk., ieslodzīto personu lietu pārvaldība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

IeVP cieši sadarbojas ar prokuratūrām un tiesām, sniedzot izmeklēšanas un tiesvedības procesa atbalstu, kā arī ar Valsts probācijas dienestu – sodu izpildes realizācijas jautājumos.

Projekta ietvaros tiks pilnveidoti šādi pamatdarbības, vadības un atbalsta, ka arī sadarbības procesi:

Apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpilde un kriminālsoda izpilde

Ieslodzīto personu vajadzību un tiesību īstenošana

Šobrīd ieslodzītās personas visas - gan sadzīviskās, gan medicīniskās, gan tiesiskās vajadzības pieprasa iesniegumu veidā papīra formātā. Savukārt ieslodzīto personu pārstāvji var iesniegumus par ieslodzīto vajadzībām iesniegt gan papīra formātā, gan sagatavot elektroniski un nosūtīt uz IeVP elektronisko pastu.

Tiks realizēta Ieslodzīto personu iesniegumu apstrādes elektronizācija. Ieslodzīto iesniegumu elektroniska apstrāde IIS palielinās šī procesa izpildes ātrumu un precizitāti, kā arī radīs priekšnosacījumus nākotnē attīstīt pilnībā elektronizētu ieslodzīto personu vajadzību un tiesību pieprasījumu procesu.

Tiks izstrādāti IIS sistēmas papildinājumi, kas ļaus IIS reģistrēt ieslodzīto personu papīra iesniegumus un veikt pilnībā elektronisku šo dokumentu plūsmas apstrādi, kā arī nodrošinās iesnieguma elektroniskās kopijas pievienošanu ieslodzītās personas lietai. Šādi tiks nodrošināts

arī ieslodzītās personas lietas elektronizācijas atbalsts, kā arī IeVP samazināts risks, ka iesnieguma izskatīšana netiek veikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā un Iesniegumu likumā noteiktai kārtībai, tādējādi pārkāpjot ieslodzīto personu tiesības.

Uz procesa pilnveides pamata tiks attīstīts publisks pakalpojums, kas ļaus ieslodzīto personu radniekiem, advokātiem un citiem pilnvarotajiem iesniegt elektroniski iesniegumus E-lietas publiskajā portālā vai izmantojot Latvija.lv koplietošanas pakalpojumu "Iesniegums iestādei". Tiks nodrošināta šī pakalpojuma apraksta ievietošana Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv., kā arī pakalpojuma statusa un izpildes rezultāta piegāde iedzīvotāja oficiālajā darbavietā Latvija.lv (e-adresē) atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 11.3 pantam. Tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezuma pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Pakalpojuma izmantošanas nodrošināšanai papildus projektā paredzētajām aktivitātēm tiks:

- veikti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (turpmāk – PIKTAPS) ietvaros "Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana" 4. darbības "IKT iespēju izmantošanas veicināšana" ietvaros (PIKTAPS) un "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" ietvaros (PSPP);
- veikti sabiedrības informēšanas pasākumi atbilstoši Tieslietu ministrijas E-lietas komunikācijas darba grupā izstrādātajiem pasākumu plāniem un izmantojot kopīgi izveidotos E-lietas vizuālās identitātes un informatīvos materiālus;
- nodrošināts sasniedzamo rezultātu rādītāju monitorings, kas ļaus novērtēt elektronisko pakalpojumu izmantošanas tendences un vajadzības gadījumā plānot koriģējošos pasākumus.

Ieslodzīto personu sagatavošana atbrīvošanai - pašvaldību un to iestāžu informēšana normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā

IeVP un ieslodzījuma vietas atbild par ieslodzīto personu sagatavošanu atbrīvošanai.

Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" ir noteikts, ka personas, kuras izcieš sodu ieslodzījuma vietā, būs jānodrošina ar dzīvojamo telpu. Līdz ar to ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms tam, kad attiecīgā persona tiek atbrīvota, ieslodzījuma vietas administrācija paziņo attiecīgajām pašvaldībām, kuru pienākums ir sniegt šāda veida palīdzību.

Paziņojumu nosūtīšana pašvaldībām par sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz Latvijas sodu izpildes kodeksa 61.3 pantā norādīto – par notiesāto sociālās rehabilitācijas līdzekļiem. Notiesāto sociālās rehabilitācijas līdzekļi ir: notiesātā sociālo problēmu risināšana, ņemot vērā ieslodzījuma radītās sekas (notiesātā sociālo prasmju uzlabošana, atjaunošana un apguves nodrošināšana, informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, personu apliecinošu dokumentu kārtošana).

Bāriņtiesas tiek informētas šādos gadījumos:

- Atbilstoši Latvijas sodu izpildes kodeksa 77.pantā noteiktajam - brīvības atņemšanas iestādes administrācija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tam, kad bērns sasniedz četrus gadu vecumu, paziņo bāriņtiesai pēc bērna vecāku dzīvesvietas, ka beidzas laiks, kurā bērns var uzturēties kopā ar māti ieslodzījuma vietā. Bāriņtiesa, iepriekš pārbaudījusi apstākļus bērna tēva dzīvesvietā, nodod bērnu tēva aprūpē. Ja bērna nodošana tēvam nav iespējama, bāriņtiesa gādā par bērna ārpusģimenes aprūpi.
- Latvijas sodu izpildes kodeksa 112.panta sestā daļa paredz, ka no nepilngadīgo audzināšanas iestādēm atbrīvotos, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, nosūta pie vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj. Ja vecāki miruši, nav zināmi vai viņiem

atņemtas aizgādības vai aprūpes tiesības vai aizbildnis ir atcelts, brīvības atņemšanas iestādes administrācija informē bāriņtiesu pēc atbrīvojamā iepriekšējās dzīvesvietas.

- Latvijas sodu izpildes kodeksa 112.2 pants paredz, ka brīvības atņemšanas iestādes administrācija pirms notiesātā atbrīvošanas pēc pilna tiesas spriedumā noteiktā soda laika izciešanas nosūta bāriņtiesai informāciju par notiesāto, kas sodu izcieš par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību. Šo informāciju nosūta ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms paredzamās notiesātā atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, bet par notiesātajiem, kas tiek atbrīvoti amnestijas vai apžēlošanas kārtībā, informāciju nosūta nekavējoties pēc amnestijas vai apžēlošanas akta saņemšanas.

Visa iepriekš nosauktā informācija tiek sagatavota elektroniski, bet sūtīta lielākoties papīra formātā ar Latvijas pasta vai kurjera starpniecību.

Lai pilnveidotu šo procesu, IIS tiks izstrādāta komponente, kas nodrošinās elektronisku informācijas sagatavošanu un nosūtīšanu valsts un pašvaldību institūcijām likumdošanā noteiktos gadījumos un kārtībā.

IIS tiks nodrošināta sagatavotā dokumenta automātiska sasaista ar ieslodzītās personas lietu, realizējot gan notikumu, kas saistīti ar ieslodzīto atbrīvošanu fiksēšanu, gan nepieciešamās informācijas pievienošanu ieslodzītā personas lietā. Informācija pašvaldību iestādēm tiks nosūtīta uz šo iestāžu oficiālo elektronisko adresi.

Informācijas nodošanai tiks izmantota oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese).

Izmeklēšana, tiesvedība un ar brīvības atņemšanu nesaistīto sodu izpilde

IeVP un ieslodzījumu vietas, sadarbojoties ar tiesām un prokuratūru, nodrošina šādu atbalstu izmeklēšanas, tiesvedības un brīvības atņemšanu nesaistīto sodu izpildes procesos:

Elektronizēta informācijas apmaiņa starp iesaistītajām iestādēm, izmantojot e-lietas koplietošanas platformu

IeVP:

- pēc pieprasījuma prokuratūrai un tiesām sniedz informāciju uz pieprasījumiem, precizējumus un izziņas par ieslodzītajām personām;
- sniedz Valsts Probācijas dienestam informāciju par ieslodzīto soda termiņu, papildsodiem, jeb kombinētajiem sodiem, krimināllikuma pantu, par notiesātā risku un vajadzību novērtējumu, piemērotajiem sodiem un pamudinājumiem, virzību pa soda izciešanas režīma pakāpēm, tādejādi atbalstot sodu izpildi ārpus brīvības atņemšanas iestādēm. Šobrīd tas tiek realizēts papīra dokumentu aprites veidā vai arī Valsts Probācijas dienesta darbinieks ierodas IeVP un uz vietas iepazītas ar ieslodzītā personas lietas materiāliem.

Ar ieslodzīto personu un tiesvedību saistīto notikumu elektroniska saskaņošana un pārvaldība

IeVP un ieslodzījumu vietas nodrošina izmeklēšanas un tiesvedības plānošanas un realizācijas procesu atbalstu, plānojot un realizējot ieslodzīto piesaisti nopratināšanās, iztiesāšanās – gan nodrošinot attālinātu tiešsaistes komunikāciju (videokonferenču iespējas), gan ieslodzīto fizisku dalību (konvojēšana).

Uz šo procesa pilnveides pamata E-lietas programmas ietvaros tiks:

- izstrādāta koplietošanas komponente E-lietas platformā, kas nodrošinās E-lietas projektu programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmu

integrāciju. IIS tiks izstrādāta datu apmaiņas saskarne - IIS komponente ārējo datu saņemšanai, apstrādei un IIS datu nodošanai:

- no IIS varēs pieprasīt un saņemt uz ieslodzīto personu attiecināmus datus (informāciju no ieslodzītā personas lietas) uz E-lietas programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmām - TIS, ProIS un PLUS;
- uz IIS automātiski, atbilstoši E-lietas koplietošanas komponentēs iestrādātām darbplūsmām, varēs saņemt datus no iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmām - TIS, ProIS, IeVP IS.
- E-lietas koplietošanas komponentu izstrādes ietvaros tiks izveidota centrāla kalendāru sinhronizācijas programmatūras komponente. Vienoto kalendāru komponente atbalstīs notikumu plānošanu, tai skaitā resursu pieejamības kontroli, un elektronisku pieteikumu saskaņošanas procesus ar visām iesaistītajām pusēm vismaz šādiem notikumiem:
 - Tiesas sēdēm;
 - Video konferencēm;
 - Ieslodzīto nopratināšanas un ieslodzīto konvojēšanas pieprasījumiem.
- IIS ir plānots papildināt ar komponenti, kas realizē ar ieslodzīto personu saistīto notikumu plānošanu un pārvaldību, iekļaujot arī videokonferenču telpu un resursu pārvaldību, kā arī nodrošinās no IIS puses integrāciju ar E-lietas kalendāru koplietošanas komponenti. Ieslodzīto kalendāri radīs iespēju elektroniski plānot ieslodzīto vizītes, konvojēšanu uz tiesas sēdēm, video konferences (t.sk. attālinātu dalību tiesvedības procesos) un citus ar ieslodzīto ikdienu saistītus notikumus.

3.1.2. Normatīvais regulējums

Šobrīd Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais ieslodzītā (apcietinātā) personas lietas saturs, no informācijas turēšanas norādījumiem secināmais turēšanas formāts, kā arī citi normatīvie regulējumi, kas saistīti ar IeVP pamatfunkciju izpildi, ir jāmaina. Ir noteikti šādi normatīvi, kuros būs nepieciešams veikt izmaiņas:

- Latvijas Soduzpildes kodeksā;
- Ministru kabineta 30.05.2006. noteikumos Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi";
- Ministru kabineta 17.01.2012. noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu";
- Ministru kabineta 09.04.2013. noteikumos Nr.191 "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība";
- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumos Nr.344 "Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo izziņu par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu";
- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumos Nr.345 "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem";
- Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā;
- Ministru kabineta 27.11.2007. noteikumos Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi".

Saistībā ar elektronizētu un automatizētu datu apmaiņu starp IIS un pārējām E-lietas programmā ietvertajām iestādēm un to informācijas sistēmām, precizējot izmantojamās datu kopas un datu

apmaiņu, būs nepieciešami papildinājumi IeVP un arī sadarbības iestāžu regulējošajos normatīvajos aktos.

Kopumā E-lietas projektu programmas ietvaros būs jāveic grozījumi normatīvajos aktos, ko konceptuāli var iedalīt trīs daļās:

- Elektroniskās lietas juridiskā spēka nostiprināšana, tai skaitā fizisko dokumentu digitālo kopiju juridiskā spēka nostiprināšana;
- Normatīvo aktu izmaiņas, kas saistītas ar biznesa procesu izmaiņām, pārejot uz darbu ar elektronisko lietu kriminālprocesa, civilprocesa, administratīvā procesa tiesās un administratīvo pārkāpumu procesa ietvaros (piemēram, kārtība kā tiek apziņoti lietas dalībnieki, kārtība kā lietas dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem, utt.);
- Normatīvo aktu izmaiņas, kas saistītas apliecinājumu fiksēšanu digitālā formā (piemēram, apliecinājums, ka liecība ir protokolēta pareizi vai apliecinājums, ka apsūdzētais ir iepazīties ar lietas materiāliem).

Nepieciešamās normatīvo aktu izmaiņas tiks apzinātas un formulētas E-lietas programmas realizācijas gaitā un to virzīšanai uz apstiprināšanu tiks izveidota Tieslietu ministrijas līmeņa darba grupa, kā arī E-lietas vienota tiesiskā regulējuma jeb “E-lietas jumta likuma” izstrādes darba grupa, kurā iesaistīti arī IeVP pārstāvji. Normatīvo aktu izmaiņas paredzēts veikt līdz 2021.gada 30.novembrim un par IIS attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanu – jauna Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma un Ministru kabineta noteikumu par Ieslodzīto informācijas sistēmas darbību - atbildīga IeVP.

3.2. *Dati*

3.2.1. *Atvērto datu kopas*

Tiks veikta atvērto datu kopu definēšana un nodrošināta IeVP datu publicēšana sabiedrībai atvērto datu formā un datu nodošana atvērto datu portālam atbilstoši noteiktajiem atvērto datu pamatprincipiem.

Projekta ietvaros pilnveidojot IIS risinājumu tiks izveidota saskarne atvērto datu nodošanai atvērto datu portālam – tā tiks izmantota IeVP izvēlēto un sagatavoto atvērto datu kopu periodiskai (reizi mēnesī un reizi gadā) nodošanai un automatizētai publicēšanai atvērto datu formā.

Pilnvērtīgai publicētās informācijas izmantošanai, tiks nodrošināti standartizēti un mašīnlasāmi metadati atvērtā formātā, katrai datu kopai sniedzot aprakstu, piemēram, par informācijas autoru, atjaunošanas biežumu, informācijas struktūru un apzīmējumu nozīmi. Publiskoto datu tīmekļa adrese tiks veidota un strukturēta atbilstoši vienotajam resursu identifikatoram (URI).

Projekta ietvaros uz atvērto datu portālu no IIS tiks nodotas šādas atvērto datu kopas:

- ieslodzīto personu depersonalizēti statistikas dati:
 - Ieslodzīto kopskaita dinamika;
 - Ieslodzīto sadalījums (pēc ieslodzījuma iemesla; dzimuma; pilsoniskās piederības; vecuma; piespriedē soda termiņa; izvietojuma veida u.c.);
 - Ieslodzīto disciplinārās prakses statistika;
 - Ieslodzīto nodarbinātības statistika;
 - Ieslodzīto izglītošanas ieslodzījuma vietās statistika;
 - Ieslodzīto iesaistes resocializācijas programmās dati;

- Notiesāto atbrīvošanas informācijas statistika.

Projekta ietvaros, izmantojot E-lietas platformas koplietošanas klasifikatoru komponenti, tiks nodrošināta arī nozares klasifikatoru publicēšana atvērto datu veidā.

3.2.2. Ieslodzītā personas lieta

Informācija par apcietinātā personas lietu (noformēšanas nepieciešamība un lietai pievienojamie dokumenti) ir noteikta Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 6.pantā, savukārt "Brīvības atņemšanas iestāžu uzskaites daļas darbības instrukcijā" ir 6.sadaļa, kas veltīta apcietināto un notiesāto personas lietu kārtīšanai.

Ieslodzītā personas lieta sastāv no trim daļām. Ieslodzītā personas lietas pirmajā daļā iekļauj:

- lēmumus par apcietinājuma piemērošanu, atcelšanu vai drošības līdzekļa grozīšanu;
- ieslodzītā daktiloskopisko karti;
- aizturēšanas protokola kopiju;
- apcietinātā anketu;
- dokumentus, kas sniedz informāciju par apcietinājuma izpildes gaitu;
- tiesas nolēmumus un notiesājošus spriedumus;
- rīkojumus par nolēmuma izpildi;
- atbrīvošanas izziņas norakstu.

Papildus 1.daļā iekļauj – IeVP norīkojumus par soda izciešanas režīmu un vietu, informāciju par soda izpildes gaitu, tajā skaitā par soda progresīvo izpildi (izvērtēšanas komisijas lēmumi).

Ieslodzītā personas lietas otrajā daļā iekļauj:

- dokumentus par iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un ieslodzīto pienākumiem;
- informatīvos materiālus par priekšmetiem un vielām, kas izņemti, personu pārmeklējot, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - aizturēto korespondenci;
- lēmumus un pieprasījumus par pārvietošanu;
- pieprasījumus un pavadvēstules, kas saistītas ar kriminālprocesu;

Ieslodzītā personas lietas trešajā daļā iekļauj:

- ieslodzītā sociālās rehabilitācijas pasākumu materiālus;
- ieslodzītā disciplinārās prakses materiālus.

Papildus tam Latvijas Sodū izpildes kodeksa 61.6 panta pirmajā daļā ir noteikts, ka notiesātā resocializācijas plānā tiek paredzēta notiesātā resocializācijas gaita un atspoguļoti notiesātā resocializācijas rezultāti. Resocializācijas plānu veido kā notiesātā personas lietas sadaļu.

Tāpat Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa noteikumu Nr.191 "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība" 15.punkts noteic, ka notiesātā izvērtēšanas materiālus un ar resocializāciju saistīto informāciju ievieto notiesātā personas lietas sadaļā "Resocializācijas lieta".

IIS Ieslodzītā personas lieta ir datu un dokumentu kopums, kuru IeVP un ieslodzījuma vietas uztur par katru ieslodzīto. IIS satur šādu informāciju par ieslodzīto personu:

- vārds, uzvārds, tēva vārds;
- personas kods;
- valstiskā piederība;
- dati par personu apliecinošu dokumentu;

- dati par iepriekšējām sodāmībām;
- dati par soda izciešanas sākumu un soda izciešanas termiņa beigām;
- dati par pārvietošanu ieslodzījuma vietās;
- dati par izvietojumu kamerās;
- dati par nosliecēm;
- dati par izglītības līmeni;
- dati par nodarbinātību ieslodzījuma vietā;
- dati par uzvedības novērtējumu;
- dati par laulāto un radniekiem;
- dati par esošajām slimībām;
- izvērtēšanas komisiju lēmumi;
- cita informācija.

Kā iepriekš minēts - daļa ieslodzītās personas lietā esošās informācijas jau tagad tiek reģistrēta digitāli IIS, joprojām par pamatu ieslodzījuma vietu pamatdarbības procesos tiek izmantota ieslodzītā personas lietas papīra versija.

Tiks veikti IIS papildinājumi, kas nodrošinās visu vajadzīgo funkcionalitāti, lai varētu atteikties no papīra ieslodzītā personas lietas, tai skaitā tiks realizēta automatizēta krimināllietu nolēmumu saņemšana no TIS un šo strukturēto datu pievienošana elektroniskai ieslodzītā personas lietai.

3.2.3. Ar Ieslodzīto personu notikumiem saistītie kalendāri

Notikumu kalendāri ir informācijas resurss, kas paredzēts starpinstitūciju līmeņa notikumu plānošanas un saskaņošanas nolūkiem. Būtiskākie notikumi, kas saskaņojami institūciju starpā ir tiesas sēdes, video konferences un darbības ar ieslodzītajiem (konvojēšana, noplatināšana, u.c.).

IIS papildinājumi paredz ieslodzīto personu kalendāru un citu IeVP resursu pārvaldības izstrādi un integrēšanu ar E-lietas platformu.

3.2.4. Vienotie klasifikatori un reģistri

Tiks pārskatīti IIS klasifikatori un reģistri. Klasifikatori un reģistri, par kuriem atbildīga IeVP, tiks izplatīti pārējām ar E-lietas koplietošanas komponentēm saistītajām informācijas sistēmām. Savukārt koplietošanas klasifikatorus un reģistrus, par kuriem atbildīgas citas ar E-lietas platformu saistītās informācijas sistēmas, IIS varēs izmantot integrējoties ar E-lietas platformas koplietošanas klasifikatoru un reģistru komponentēm.

3.3. Programmatūra

IIS ir veidota kā klients-serveris tipa programmatūra, kam ir viens centrālais serveris, pa reģionālajam serverim katrā no ieslodzījuma vietām un uz katras no darbstacijām uzstādāma klienta aplikācija. IIS pieejama tikai IeVP iekšējā tīklā. IIS satur šādas funkcionālās sadaļas:

- Ieslodzītā lieta, kas ļauj digitāli uzturēt lielāko daļu ieslodzītā datu, tai skaitā, bet ne tikai - ieslodzītā personas datus, iepriekšējās sodāmības, krimināllietu nolēmumu datus, piespriestos sodus, izciestos sodus, ieslodzījuma vietā reģistrētos pārkāpumus, valodas, izglītību, nodarbinātību, veselības traucējumus, izvietojuma datus, u.c. informāciju;

- Uzdevumi, kas nodrošina IeVP un ieslodzījuma vietu darbiniekiem uzdoto uzdevumu atsekošanu;
- Pārskati, kas nodrošina vairāku fiksētu pārskatu izgūšanas iespējas.

IIS programmatūras attīstība paredz:

- Sistēmas pārvešanu no klients-serveris arhitektūras uz trīs līmeņu tīmekļa arhitektūru, kas atvieglos sistēmas administrēšanu un ir radīs priekšnosacījumu tās integrācijai ar E-lietas platformu;
- integrāciju ar E-lietas platformu, kuras rezultātā sistēmā tiks nodrošināta automatizēta tiesas nolēmumu saņemšana, klasifikatoru un reģistru koplietošana un tiesvedības notikumu plānošana un saskaņošana. Integrācijas ietvaros IIS tiks integrēts ar šādām E-lietas koplietošanas komponentēm:
 - **E-lietas publisko portālu**, kas būs vienots sabiedrībai paredzēts piekļuves punkts ar tiesvedību un sodu izpildi saistītajiem datiem un pakalpojumiem. E-lietas publiskajā portālā būs izvietots IeVP elektroniskais pakalpojums, kas ļaus ieslodzīto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem iesniegt iesniegumus. E-lietas publiskajā portālā lietotāju autentifikācija tiks veikta izmantojot VRAA VISS vienotās pieteikšanās koplietošanas komponenti. Tiks nodrošināta pakalpojumu aprakstu un saites uz pakalpojuma izsaukšanu ievietošana Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv, kā arī pakalpojumu statusa un izpildes rezultāta piegāde iedzīvotāja oficiālajā e-adresē Latvija.lv. Tiks uzkrāta informācija, kas iekļauj vismaz pakalpojumu pieprasījumu skaitu, to izpildes informāciju un rezultātu griezuma pa mēnešiem un pakalpojumu saņēmējiem. Tiks nodrošināta pakalpojumu uzskaites informācijas nodošana uz Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.
 - **Vienotajiem kalendāriem**, kas nodrošinās tiesvedības notikumu, tai skaitā tiesas sēžu, video konferenču, ieslodzīto nopratināšanu un ieslodzīto konvojēšanu, plānošanu, saskaņošanu un uzskaiti.
 - **Koplietošanas klasifikatoru** komponenti, kas nodrošinās ar tiesvedību saistīto koplietošanas klasifikatoru izplatīšanu un saņemšanu, tai skaitā nodošanu atvērto datu portālam.
 - **Koplietošanas reģistru** komponenti, kas nodrošinās IIS reģistru izplatīšanu un citu iestāžu nodrošināto reģistru informācijas saņemšanu.
- ar ieslodzītajiem saistīto tiesvedības notikumu kalendāru izstrādi, kas ļaus apskatīt un saskaņot paredzētos tiesvedības notikumus, tai skaitā ieslodzīto nopratināšanas, ieslodzīto konvojēšanas un videokonferences ar ieslodzītajiem;
- iespēju reģistrēt un apstrādāt ieslodzīto iesniegumus;
- operatīvo un statistikas pārskatu papildinājumus;
- starpsistēmu integrācijas papildinājumus, tai skaitā VZD VAR izmantošanu, papildinājumus integrācijā ar Iedzīvotāju reģistru un Sodu reģistru, kā arī informācijas nosūtīšanu (sarakstes veidā) uz pašvaldības oficiālo e-adresi
- izstrādāt starpsistēmu datu apmaiņas saskarni ar oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmu, lai varētu nodrošināt fizisko personu oficiālās elektroniskās adreses deaktivizēšanu uz laiku, kurā tā atrodas ieslodzījuma vietā, izņemot fizisko personu, kura brīvības atņemšanas sodu izcieš atklātajā cietumā;
- sistēmas darbināšanas gaitā konstatēto nepilnību novēršanu.

Plānojot risinājumu, ir apskatītas Eiropas Savienības gatavo koplietošanas risinājumu izmantošanas iespējas, taču, izvērtējot gatavos koplietošanas risinājumus, secināms, ka tie nav izmantojami Projekta ietvaros attīstāmās programmatūras ietvaros. Vienlaikus ir paredzēts realizēt risinājumus, kas nodrošinātu E-lietas programmas un VRAA VISS koplietošanas komponentu izmantošanu. Ja projekta realizācijas gaitā tiks identificēts, ka saņemtajai vai nodotajai datu kopai var būt vairāk kā viens patērētājs, datu apmaiņai E-lietas risinājuma ietvaros un E-lietas publiskajā portālā saskarnes pēc iespējas tiks izstrādātas universālas un atkalizmantojamas.

Informācija par projekta ietvaros izstrādātajiem risinājumiem, tehniskajiem un informācijas resursiem tiks publicēta VIRSIS.

IIS pilnveidojumu darbināšanai nepieciešams iegādāties datu bāzes vadības sistēmas un personāla uzskaites sērijveida programmatūras licences.

3.4. Infrastruktūra

IIS darbināšanai nepieciešamā infrastruktūra ietver serverus, rezerves kopēšanas iekārtas, tīkla komutācijas un aizsardzības iekārtas, nepārtrauktās barošanas iekārtas, kabeļus, statnes u.c. nepieciešamo infrastruktūras aprīkojumu, kā arī standarta programmatūru (operētājsistēmu, datu bāzes vadības sistēmu, pretvīrusu programmatūru, utt.), kuras paplašināšanu iespējams veikt neatkarīgi no sistēmas programmatūras.

IIS veidots kā klienta-servera risinājums ar vienu centrālo serveri. IIS programmatūras serveri izmanto MS Windows Server 2008 R2 Standard operētājsistēmu un MS SQL Server 2008 R2 datu bāzes vadības sistēmu.

Projekta ietvaros IIS pilnveidojumu darbināšanai izmantojamo infrastruktūru nepieciešams papildināt ar Oracle Database Standard Edition 2 datu bāzes vadības sistēmu un personāla uzskaites sistēmu KADRI. Sistēma KADRI nodrošinās ieslodzītās personas lietas datu apstrādi un darba plūsmas procesu atbildīgo amatpersonu identificēšanu.

3.5. Mijiedarbība ar pašvaldībām

IeVP pašvaldībām nodod informāciju šādos gadījumos:

- Bāriņtiesām par ieslodzīto atbrīvošanu, kuras atbilst Latvijas sodu izpildes kodeksa 112.2 pantam;
- Bāriņtiesām trīs mēnešus pirms tam, kad bērns sasniedz četru gadu vecumu, paziņo, ka beidzas laiks, kurā bērns var uzturēties kopā ar māti ieslodzījuma vietā;
- Attiecīgo bāriņtiesu par tāda nepilngadīgā apcietinātā atbrīvošanu no izmeklēšanas cietuma, kuram nav vecāku vai aizbildņu, lai tā šo nepilngadīgo iekārtotu dzīvesvietā un risinātu viņa sociālā nodrošinājuma problēmas;
- Pašvaldību sociālajiem dienestiem par nepieciešamību saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus;
- Pašvaldībām par dzīvesvietas jautājumu risināšanu.

Informācijas nodošana balstās uz individuāliem gadījumiem un tiek organizēta oficiālās sarakstes veidā, lai nodrošinātu IeVP klientam efektīvāko un kvalitatīvāko jautājumu atrisināšanu. Īstenojot Projektu, IIS tiks pielāgota sūtījumu sūtīšanai uz oficiālo elektronisko adresi, izmantojot Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (DIV). Veicot IIS integrāciju ar Oficiālās elektroniskās adreses IKT risinājumu, pašvaldību vajadzībām nepieciešamā informācija tiks sūtīta no IIS uz pašvaldības oficiālo e-adresi (sk. 2014.gada 03.marta Ministra Kabineta noteikumus Nr.90 «Par Oficiālās elektroniskās adreses

konceptiju»), sarakstes formā precizējot nepieciešamo informāciju. Pašvaldību koplietošanas informācijas sistēmu pielāgošana šīs informācijas izmantošanai pašvaldībās nav nepieciešama. Informācijas nodošanas pieeja tika prezentēta Latvijas Pašvaldību savienībai un Latvijas Lielo pilsētu asociācijai un saskaņota ar pašvaldībām 2016.gada 20.oktobrī.

4. Projekta ieguldījums SAM rādītājos un projekta sociālekonomiskā indikatīvā lietderība

4.1. Ieguldījums SAM rādītāju sasniegšanā

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM mērķu sasniegšanu:

- Nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus;
- Nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti;
- Nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;
- Radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, t.sk. lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības, analīzes, u.c. mērķiem.

Projekta ietvaros attīstāmās IIS risinājumi ir vērsti arī uz ieslodzītajām personām un citiem IeVP klientiem, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī SAM rezultāta rādītājos. Elektronizējot ieslodzīto personu, to radnieku, advokātu un citu IeVP klientu iesniegumus, tiek plānots pilnībā pāriet uz e-pakalpojumiem.

Sagatavojot un publicējot atvērtos datus Datu publicēšanas platformā, Projekts sniegs ieguldījumu Latvijas reitingā *PSI Scoreboard* datu atkalizmantošanas indeksā.

Īstenojot projekta darbības, projekts sniegts ieguldījumu arī SAM iznākuma rādītājos, pilnveidojot šādus 4 darbības procesus:

- Ieslodzīto personu vajadzību un tiesību realizācija;
- Ieslodzīto personu sagatavošana atbrīvošanai;
- Ar ieslodzīto personu un tiesvedību saistīto notikumu elektroniska saskaņošana un pārvaldība;
- Elektronizēta informācijas apmaiņa starp iesaistītajām iestādēm, izmantojot e-lietas koplietošanas platformu.

4.2. Sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums

Projekts ir vērsts uz IeVP darbības efektivitātes uzlabošanu, mazinot ar kriminālprocesa virzību un soda izciešanu saistīto dokumentu plūsmas laiku, tādējādi nodrošinot Tieslietu ministrijas darbības prioritātes - tiesu sistēmas un tiesībsargājošo institūciju darbības un procesu uzlabošana un kapacitātes stiprināšana – realizāciju.

Projektam tika noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi:

1. Elektroniski apkopojot IeVP statistikas informāciju, samazināsies patērētais laiks, kuru IeVP darbinieki patērē statistikas pārskatu izstrādei. Īstenojot Projektu, tiek sagaidīts, ka IeVP darbiniekiem būs iespējams ietaupīt līdz pat 75% patērētā laika katra statistikas pārskata izveidei (1470 informācijas pieprasījumi gadā), gada ietvaros radot ieguvumu aptuveni 198 000 eiro apmērā, un Projekta pārskata periodā, t.i. līdz 2029. gadam, sniegs IeVP darbinieku resursu ietaupījumu aptuveni **1,3 milj. eiro** (diskontētā vērtība) apmērā.
2. Digitalizējot nolēmumu saņemšanas plūsmu, tiks samazināts IeVP darbinieku patērētais laiks darbam ar nolēmumiem (aptuveni 10 000 nolēmumi gadā). Līdz šim papīra formātā saņemtie nolēmumi tika manuālā veidā reģistrēti IIS. Pēc Projekta ieviešanas nolēmumi no tiesām un citām tieslietu nozares iestādēm tiks saņemti elektroniski, ļaujot IeVP darbiniekiem līdz 75% samazināt nolēmumu reģistrēšanai patērēto laiku, kas gada ietvaros radīs ietaupījumu 32 000 eiro apmērā, Projekta pārskata periodā kopējais ieguvums IeVP sasniegs **214 000 eiro** (diskontētā vērtība).
3. Elektronizētas dokumentu plūsmas rezultātā IeVP darbiniekiem būs iespējams apstrādāt ieslodzīto personu un to radnieku iesniegumus elektroniski, ietaupot laiku, kuru pašlaik IeVP darbinieki pavada papīra formāta iesniegumu apstrādei (24 200 iesniegumi gadā). Pēc Projekta ieviešanas paredzēts, ka IeVP darbinieki iesniegumus spēs izskatīt par apmēram 20% mazākā laikā, gada ietvaros radot 12 795 eiro ietaupījumu, kā rezultātā IeVP administratīvā sloga samazinājums Projekta pārskata periodā veido **85 000 eiro** (diskontētā vērtība).
4. Statistikas informācijas elektroniska apkopošana ļaus IeVP statistikas informācijas pieprasītājiem ietaupīt apmēram stundu gadā, iegūstot nepieciešamo informāciju elektroniski atkalizmantojamo datu veidā. Gada ietvaros tas radīs 6400 eiro ieguvumu, sabiedrībai, Projekta pārskata periodā, sniedzot **43 000 eiro** (diskontētā vērtība) ieguvumu.

Projekta īstenošanas rezultātā IeVP darbinieku darba laika ietaupījumu ir paredzēts izmantot ar viņu darbu saistīto pakalpojumu vai funkciju izpildes kvalitātes uzlabošanai, tāpēc projekta rezultātā nav paredzēts samazināt IeVP iestāžu darba vietas.

Tabula Nr. 3 atspoguļo Projekta izmaksu un ieguvumu indikatīvo naudas plūsmu.

Detalizēta projekta indikatīvo ieguvumu aprēķina izklāsts, t.sk. aprēķina pieņēmumi un datu avoti, sniegts šī dokumenta 2.pielikumā (MS Excel datne, projekta ieguvumu analīze).

Tabula Nr. 3 Projekta izmaksu un ieguvumu naudas plūsmas kopsavilkums

| Pozīcija | Kopā nedisk. | Kopā disk. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Projekta ieguvumi | 2 433 138 | 1 622 982 | 0 | 0 | 0 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 |
| Samazinātas iestāžu izmaksas, elektroniski apkopojot statistikas informāciju | 1 982 957 | 1 322 696 | 0 | 0 | 0 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 | 198 296 |
| Samazinātas iestādes izmaksas, digitalizējot nolēmumu (spriedumu) saņemšanas plūsmu | 322 224 | 214 934 | 0 | 0 | 0 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 | 32 222 |
| Samazināts IeVP darbinieku laiks, elektronizējot un automatizējot ieslodzīto personu iesniegumu dokumentu apstrādes plūsmu | 127 958 | 85 352 | 0 | 0 | 0 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 | 12 796 |
| Sabiedrības izmaksu samazinājums, sniedzot atkalizmantošanas datus | 64 538 | 43 049 | 0 | 0 | 0 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 | 6 454 |
| Ar projekta ieviešanu saistītie izdevumi | 475 000 | 420 581 | 0 | 237 500 | 237 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekta ieguldījumi | 475 000 | 420 581 | 0 | 237 500 | 237 500 | 0 | | | | | | | | | |
| Naudas plūsma (nediskontēta) | 2 022 676 | | 0 | -237 500 | -237 500 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 | 249 768 |
| Naudas plūsma (diskontēta) | | 1,629,515 | | | | | | | | | | | | | |

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) 1 245 450

Ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) 42%

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) 3,9

Kopumā paredzēts, ka pēc Projekta pilnīgas ieviešanas Projekta sociālekonomiskie ieguvumi Projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, sasniegs aptuveni **1,2 milj. eiro**.

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir **3,9**, ekonomiskā ienesīguma norma - **42%**, kas apliecina Projekta īstenošanas lietderību.

5. Projekta darbības, laika plāns un izmaksas

5.1. Projekta darbības un to rezultāti

Tabula Nr. 4 Projekta darbību kopsavilkums

| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts (iznākums) | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | | Iesaistītie partneri** |
|--------|---|---|---|--------------------------------|------------|---|
| | | | | Skaitis | Mērvienība | |
| 1. | Projekta vadība un administrēšana | Projekta vadības pakalpojumi, t.sk. veikta projekta pārvaldība atbilstoši 6. nodaļā aprakstītajai projekta pārvaldības organizācijai. Projekta realizācijai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana ar uzraugošajām iestādēm. | Īstenots projekts | 1 | Gab. | |
| 2. | IIS pilnveidojumu izstrādes tehniskās specifikācijas sagatavošana | IIS pilnveidojumu tehniskās specifikācijas izstrāde, IIS pilnveidojumu izstrādes iepirkuma organizēšana un veikšana, līguma noslēgšana par IIS pilnveidošanu | Izstrādāta IIS pilnveidojumu tehniskā specifikācija | 1 | Gab. | Tiesu administrācija; Prokuratūra; Valsts probācijas dienests |
| 3. | IIS pilnveidojumu izstrāde | IIS pilnveidojumu izstrāde, tai skaitā IIS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm. | | | | |
| 3.1. | IIS programmatūras uzlabojumu izstrāde | IIS programmatūras uzlabojumu izstrāde, tai skaitā: <ul style="list-style-type: none"> Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) izstrāde; Iteratīva E-lietas platformas koplietošanas komponentu izstrāde; Testa, akcepttesta un apmācību vides izveide; | Produkcijas vidē ieviesti IIS programmatūras uzlabojumi | 1 | Gab. | |

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Programmatūras funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana; • IIS pilnveidojumu darbināšanai nepieciešamo sērijveida programmatūras licenču iegāde (ieskaitot programmatūras uzturēšanu). | | | | |
| 3.2. | IIS integrācija ar E-lietas platformu | <p>IIS integrācija ar E-lietas platformu, tai skaitā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prasību analīze un programmatūras prasību specifikācijas (PPS) izstrāde; • Programmatūras projektējuma apraksta (PPA) izstrāde; • Iteratīva E-lietas platformas koplietošanas komponentu izstrāde; • Testa, akcepttesta un apmācību vides izveide; • Programmatūras funkcionalitātes, lietojamības un drošības testēšana. | Produkcijas vidē ieviesta IIS integrācija ar E-lietas koplietošanas komponentēm | 1 | Gab. | Tiesu administrācija; Prokuratūra; Valsts probācijas dienests |
| 4. | IIS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība | IIS pilnveidojumu izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole, kas ietver vismaz programmatūras izstrādes uzraudzību, izstrādāto programmatūras nodevumu un dokumentācijas nodevumu atbilstības pārbaudi, programmatūras nodevumu akcept testēšanu | Dokumentu kopums, kas apliecina, ka pilnveidotā IIS atbilst tehniskās specifikācijas un lietotāju prasībām | 1 | Gab. | |
| 5. | Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits | IIS pilnveidojumu drošības un veiktspējas audita iepirkuma veikšana, drošības un veiktspējas audita veikšana, IIS pilnveidojumu uzlabošana atbilstoši drošības un veiktspējas audita rezultātiem | | | | |
| 5.1. | Izstrādātās programmatūras drošības audits | Drošības audita iepirkuma organizēšana, drošības audita veikšana | Veikts IIS pilnveidojumu drošības audits | 1 | Gab. | |
| 5.2. | Izstrādātās programmatūras veiktspējas audits | Veiktspējas audita iepirkuma organizēšana, veiktspējas audita veikšana | Veikts IIS pilnveidojumu veiktspējas audits | 1 | Gab. | |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|---|-----------|--|
| 6. | Lietotāju apmācības | Administratoru un to informācijas sistēmas lietotāju, kuri, izmantojot informācijas sistēmu, nodrošina pakalpojumu sniegšanu, apmācības | Veiktas lietotāju apmācības | 1 | Gab. | |
| 7. | Publicitātes nodrošināšana | Tiks nodrošināti publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitāti, saziņu un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu | Informatīvā plāksne un informācija par projektu izvietota www.ievp.gov.lv | 1 | Komplekts | |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

5.2. Projekta darbību īstenošanas laika grafiks

Tabula Nr. 5 Projekta darbību īstenošanas laika grafiks

| Nr.p.k. | Darbības nosaukums | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Projekta pārvaldība un administrēšana | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. | IIS pilnveidojumu izstrādes tehniskās specifikācijas sagatavošana un izstrādes iepirkums | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | IIS pilnveidojumu izstrāde | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. | IIS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Izstrādātās programmatūras drošības un veiktspējas audits | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |

| Nr.p.k. | Darbības nosaukums | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|---|---|---|---|
| | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | | |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | | | | |
| 6. | Lietotāju apmācības | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| 7. | Publicitātes nodrošināšana | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. | Normatīvo aktu izmaiņu sagatavošana un virzība apstiprināšanai | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

5.3. Projekta izmaksu sadalījums

Tabula Nr. 6 Kopējās projekta izmaksas


| Nr.p.k. | Finansējuma avots | 2018, euro | 2019, euro | 2020, euro | 2021, euro | KOPĀ, euro | % |
|---------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. | ERAF finansējums | 20 757 | 18 073 | 198 650 | 166 270 | 403 750 | 85% |
| 2. | Valsts budžeta finansējums | 3 663 | 3 189 | 35 056 | 29 342 | 71 250 | 15% |
| 3. | Pašvaldības budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kopējās izmaksas | 24 420 | 21 262 | 233 706 | 195 612 | 475 000 | 100% |

Tabula Nr. 7 Ieslodzīto informācijas sistēmas uzturēšanas ikgadējās izmaksas

| Nr.p.k. | Nepieciešamās IKT risinājuma uzturēšanas izmaksas | <i>2021, euro</i> | <i>2022, euro</i> | <i>2023, euro</i> | <i>2024, euro</i> | KOPĀ, euro |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | <i>Ieslodzīto informācijas sistēmas uzturēšana</i> | 4 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 154 000 |

6. Projekta pārvaldība

Projekta īstenošanai tiks izveidota strukturēta Projekta pārvaldības organizācija, kas ietver skaidru Projekta īstenošanā iesaistīto pušu lomu un atbildību, savstarpējās sadarbības un lēmumu pieņemšanas principu definējumu (sk. Attēls Nr. 5)

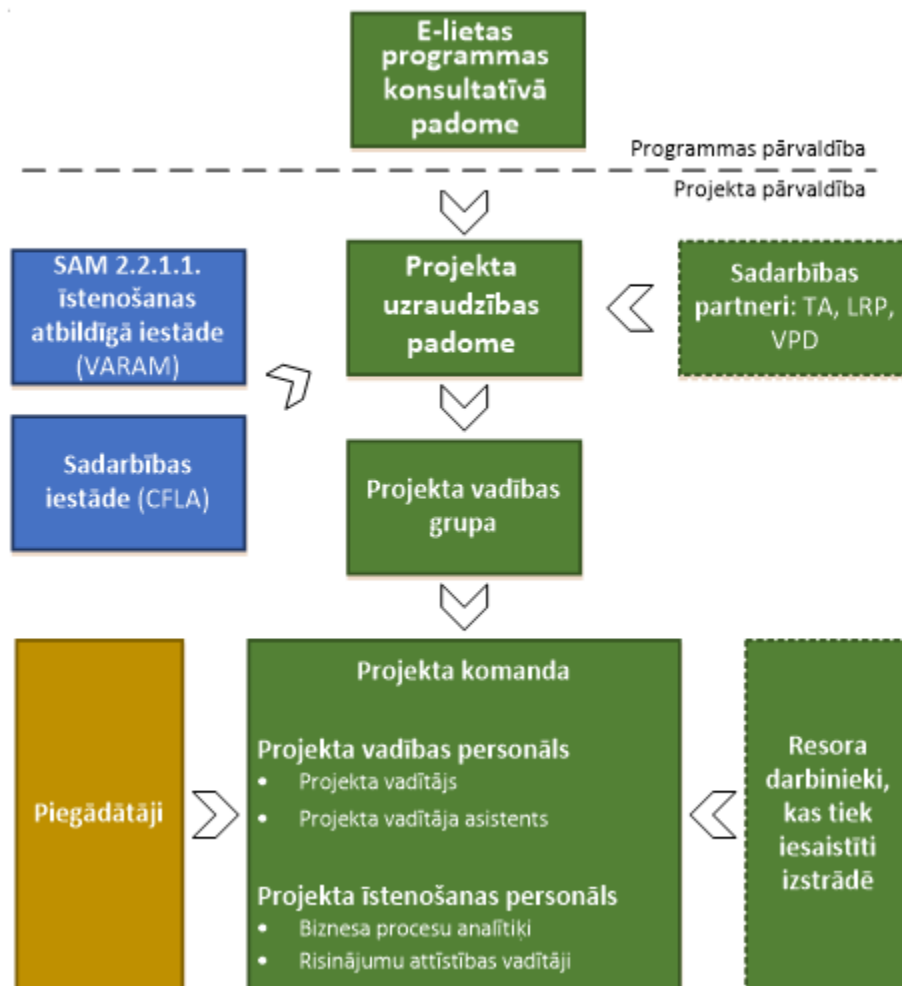

Attēls Nr. 5 Projekta organizācijas shēma

Projekta pārvaldības organizācija ir pakļauta E-lietas programmas pārvaldības struktūrai. Projekta pārvaldības ietvaros tiek definēta šāda organizatoriskā struktūra:

1. **Projekta uzraudzības padome** – augstākā līmeņa struktūra, kuras dalībnieki ir IeVP vadītājs, Projekta sadarbības partneru deleģētie pārstāvji, IeVP projekta vadītājs. Padome ir atbildīga par visu E-lietas programmas projektu rezultātu sasniegšanu, tā uzrauga Projekta aktivitātes, pārstāv Projekta īstenošanu, uzrauga, vai Projekta rezultāts atbilst gala lietotāja un sadarbības partneru vajadzībām, akceptē Projekta izmaiņas un lemj par Projekta izmaiņu nepieciešamību, ja pēc tādām rodas vajadzība ārēju faktoru dēļ.
2. **Projekta vadības grupa** - vadības līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir IeVP projekta vadītājs, IeVP vadības pārstāvji, IeVP amatpersonas IT pārvaldības jautājumos, sadarbības partneru iestāžu pārstāvji, Izstrādātāja vadība. Vadības grupa identificē un sagatavo lēmumus par nepieciešamajām Projekta izmaiņām, formāli akceptē, pieņem un pēc būtības izvērtē nodevumu, koordinē Projekta aktivitātes, vada piegādātāju darbu, uztur risku reģistru, dod darba uzdevumus izpildītājiem, sagatavo iepirkumu dokumentāciju (t.sk. tehniskās specifikācijas utt.), sagatavo atskaites un informāciju par

projektu statusu uzraugošajām institūcijām. Projekta vadības grupa uzrauga Projekta komandas darbu.

3. **Projekta vadītājs** – IeVP norīkots Projekta vadītājs, kura atbildībā ir Projekta darbības norise saskaņā ar Projekta laika grafiku un finansējuma plānu, atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam. Specifisku uzdevumu veikšanai, Projekta vadītājs pēc nepieciešamības piesaista kompetentās un deleģētās amatpersonas no attiecīgajiem IeVP struktūrvienībām un/vai sadarbības partneru iestādēm.
4. **Projekta komanda** – izpildes līmeņa struktūra, kuras sastāvā ir IeVP Projekta vadītājs un IeVP speciālisti, Izstrādātāja un izstrādes kvalitātes uzraudzības Projekta vadītāji un izstrādes projekta komanda, sadarbības partneru deleģētie speciālisti. Projekta komandas uzdevums ir īstenot Projekta aktivitātes piešķirtā budžeta un noteikto aktivitāšu izpildes termiņu ietvaros. Projekta komandu vada Projekta vadītājs, kas nodrošina Projekta komandas kompetencē esošo aktivitāšu koordinēšanu, to īstenošanas uzraudzību un informācijas sniegšanu Projekta vadības grupai par Projekta īstenošanas progresu. Tāpat Projekta komanda nodrošina nepieciešamās dokumentācijas apkopošanu un sagatavošanu, atbilstoši noteiktajiem standartiem un izvirzītajiem nosacījumiem.
5. **ERAF sadarbības iestāde** - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA);
6. **SAM atbildīgā iestāde** - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" atbildīgā iestāde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
7. **Sadarbības partneri** – iesaistīti Projekta aktivitātēs, nodrošina Projekta mērķu sasniegšanu sadarbības līgumā noteiktajā apjomā (sk. Tabula Nr. 8).

Tabula Nr. 8 Projekta partneru lomas

| Partnera/ sadarbības iestādes | Loma projektā | Loma pēc projekta |
|-------------------------------------|--|---|
| Tiesu administrācija | Atbildīgā iestāde par E-lietas programmas un IS attīstības/pilnveides projektu aprakstu izstrādi. Atbildīgā iestāde par Tiesu informatīvās sistēmas attīstību un E-lietas koplietošanas komponentu, tai skaitā E-lietas publiskā portāla izstrādi. | E-lietas koplietošanas komponentu pārvaldība un darbības nodrošināšana pēc Tiesu informatīvās sistēmas attīstības projekta pabeigšanas. |
| Prokuratūra | Atbildīgā iestāde par Prokuratūras informācijas sistēmas attīstību un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentu, nodrošinot tiesām nepieciešamās informācijas pieejamību. | Datu apmaiņas saskarņu darbības nodrošināšana pēc Prokuratūras informācijas sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas. |

| Partnera/ sadarbības iestādes | Loma projektā | Loma pēc projekta |
|--|--|---|
| | Atbildīgā iestāde par dokumentu skanēšanas aplikācijas izstrādi. | Dokumentu skanēšanas aplikācijas uzturēšana. |
| Valsts probācijas dienests | Atbildīgā iestāde par Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanu un tās integrāciju ar E-lietas koplietošanas komponentēm, nodrošinot tiesām nepieciešamās informācijas automatizētu apmaiņu ar Valsts probācijas dienestu. | Datu apmaiņas saskarnes darbības nodrošināšana pēc Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanas projekta pabeigšanas. |
