



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

IZAICINĀJUMI UN AKTUĀLIE JAUTĀJUMI PROJEKTU IEVIEŠANĀ

Liene Rulle,
CFLA Zemgales reģiona nodaļas vadītāja

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ




IESKATS *VARAM*
PĀRRAUDZĪTO PROGRAMMU
KOPĒJĀ PROJEKTU STATISTIKĀ



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

VARAM PĀRRAUDZĪTO ES FONDU PROGRAMMU PROJEKTU SKAITS UN FINANSĒJUMS REĢIONOS

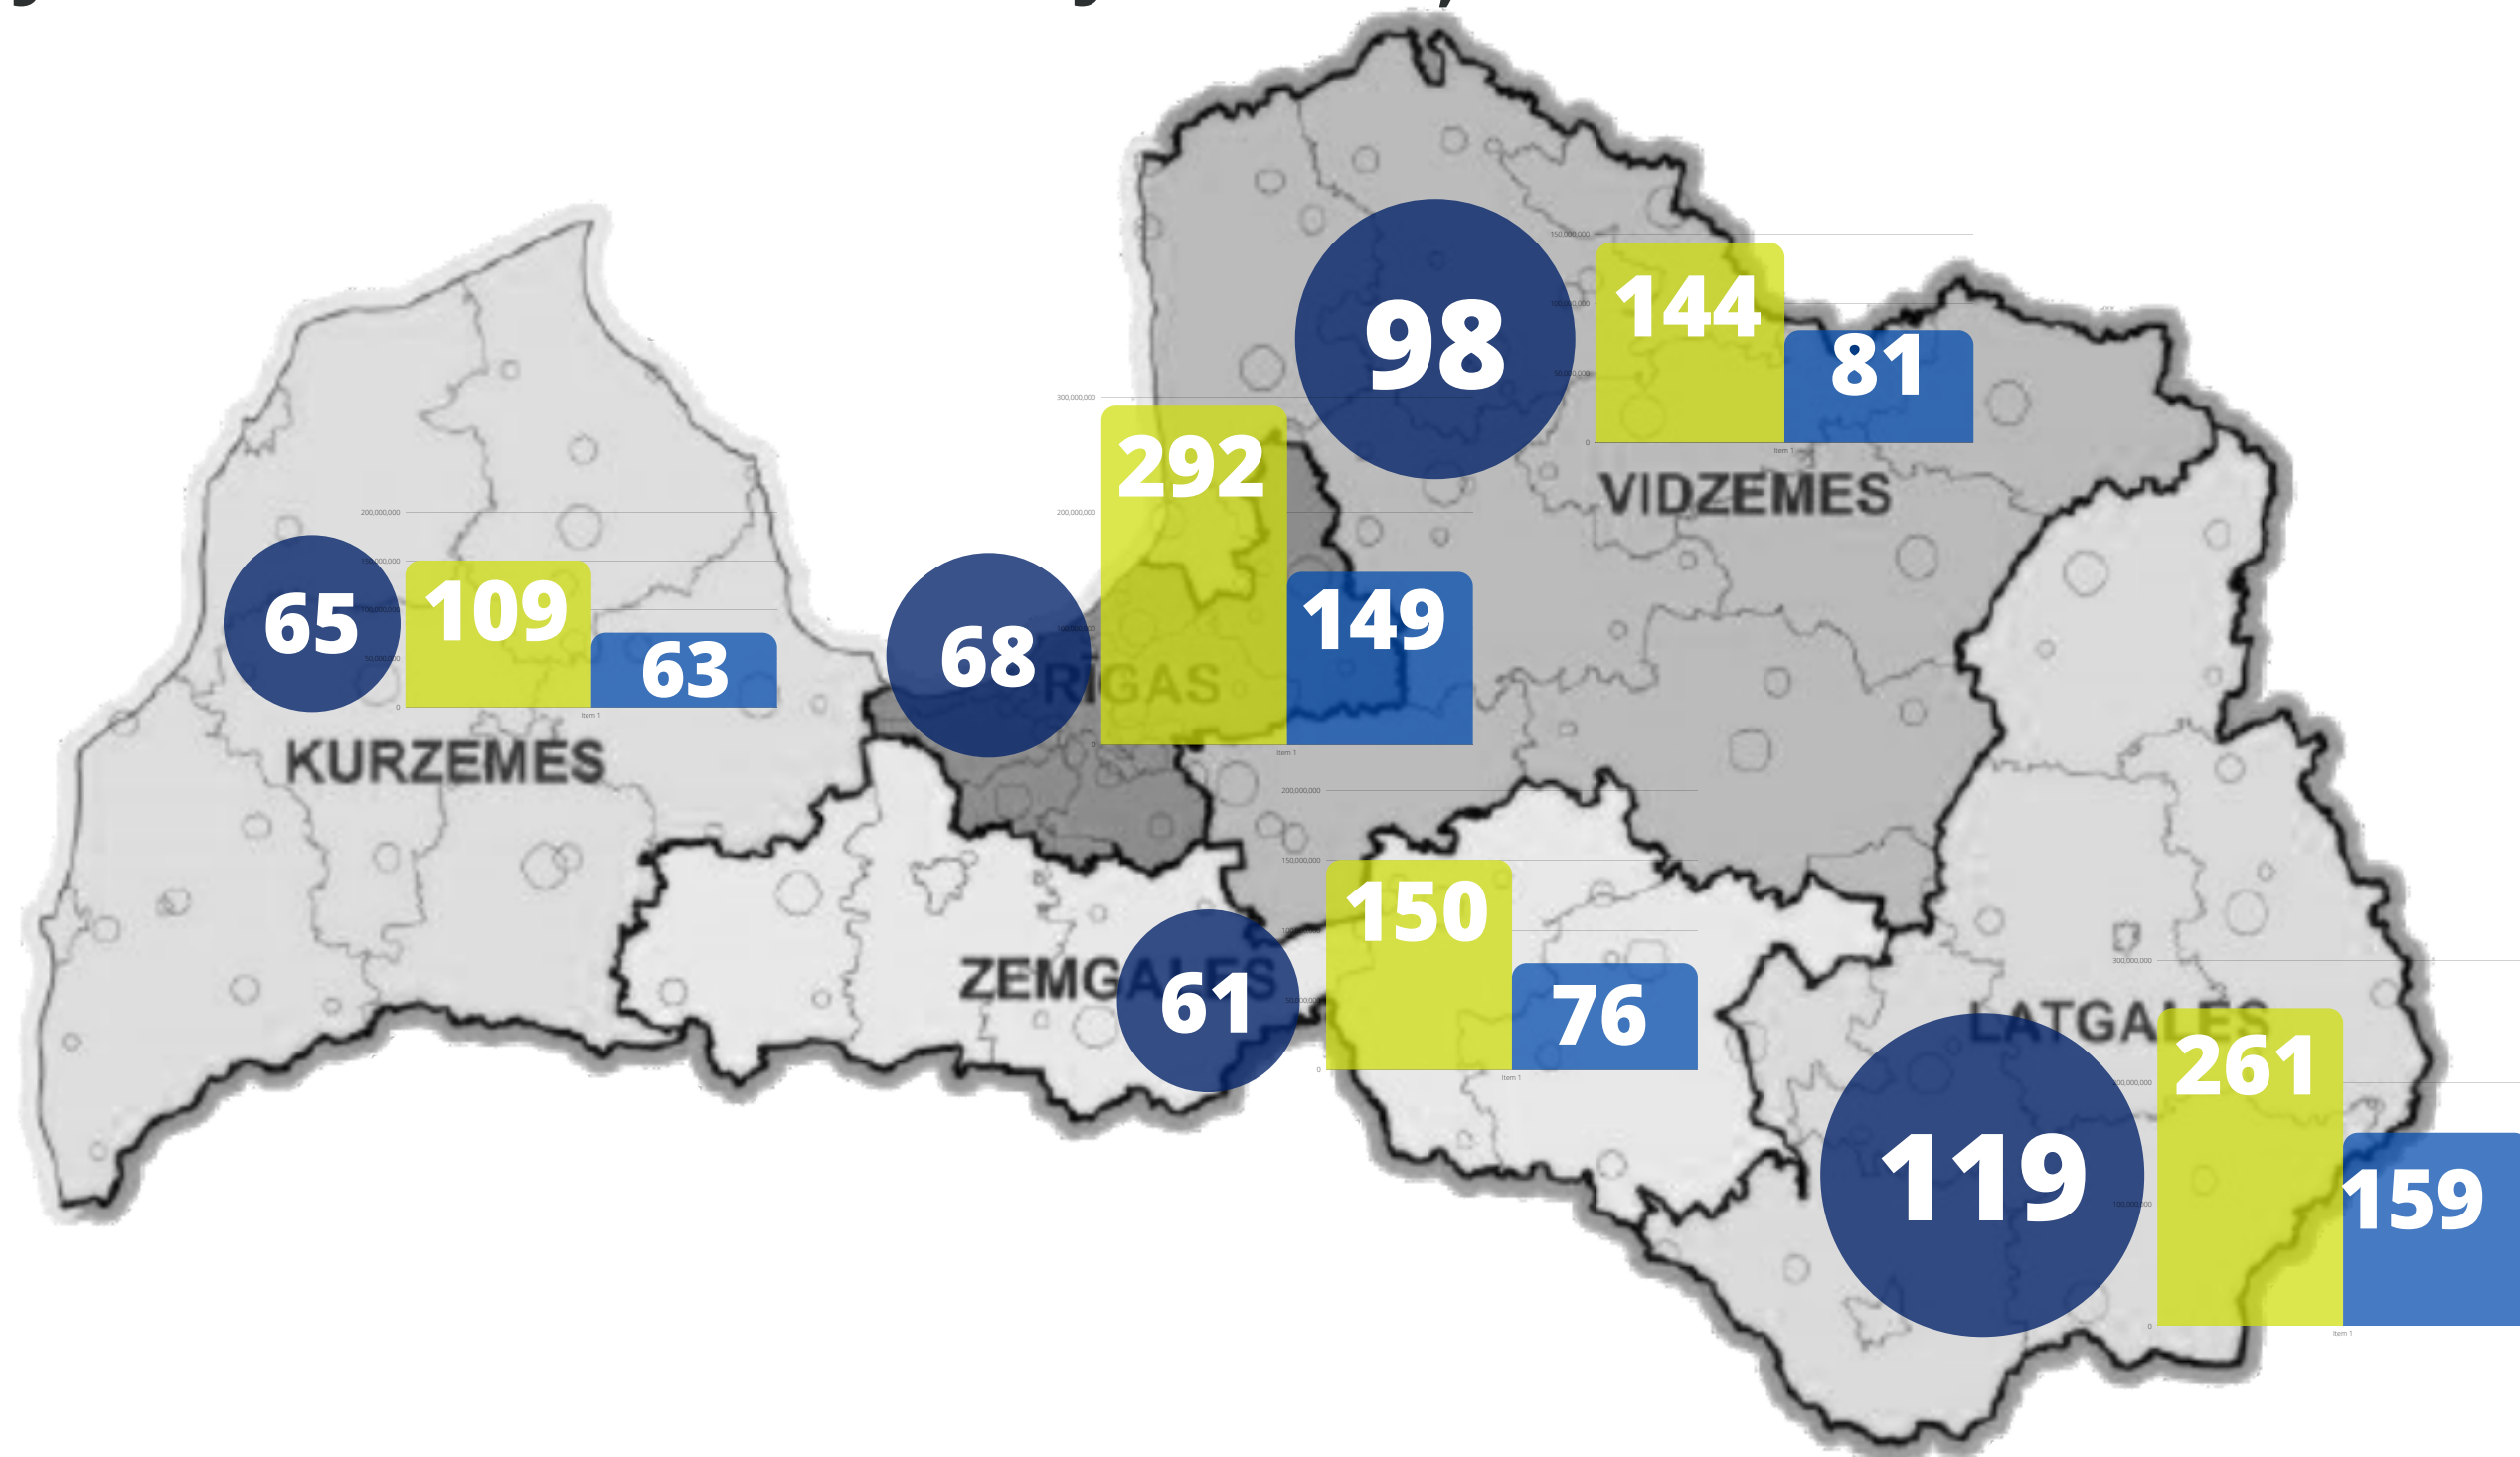

● Projektu skaits

■ Kopējais finansējums, milj. eiro


■ ES fondu finansējums, milj. eiro

*neietverot SAM 2.2.1, 5.4.2., 5.4.3.; dati uz 2021. g. nov.




Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES VEIČINĀŠANA PAŠVALDĪBĀS (3.3.1.)

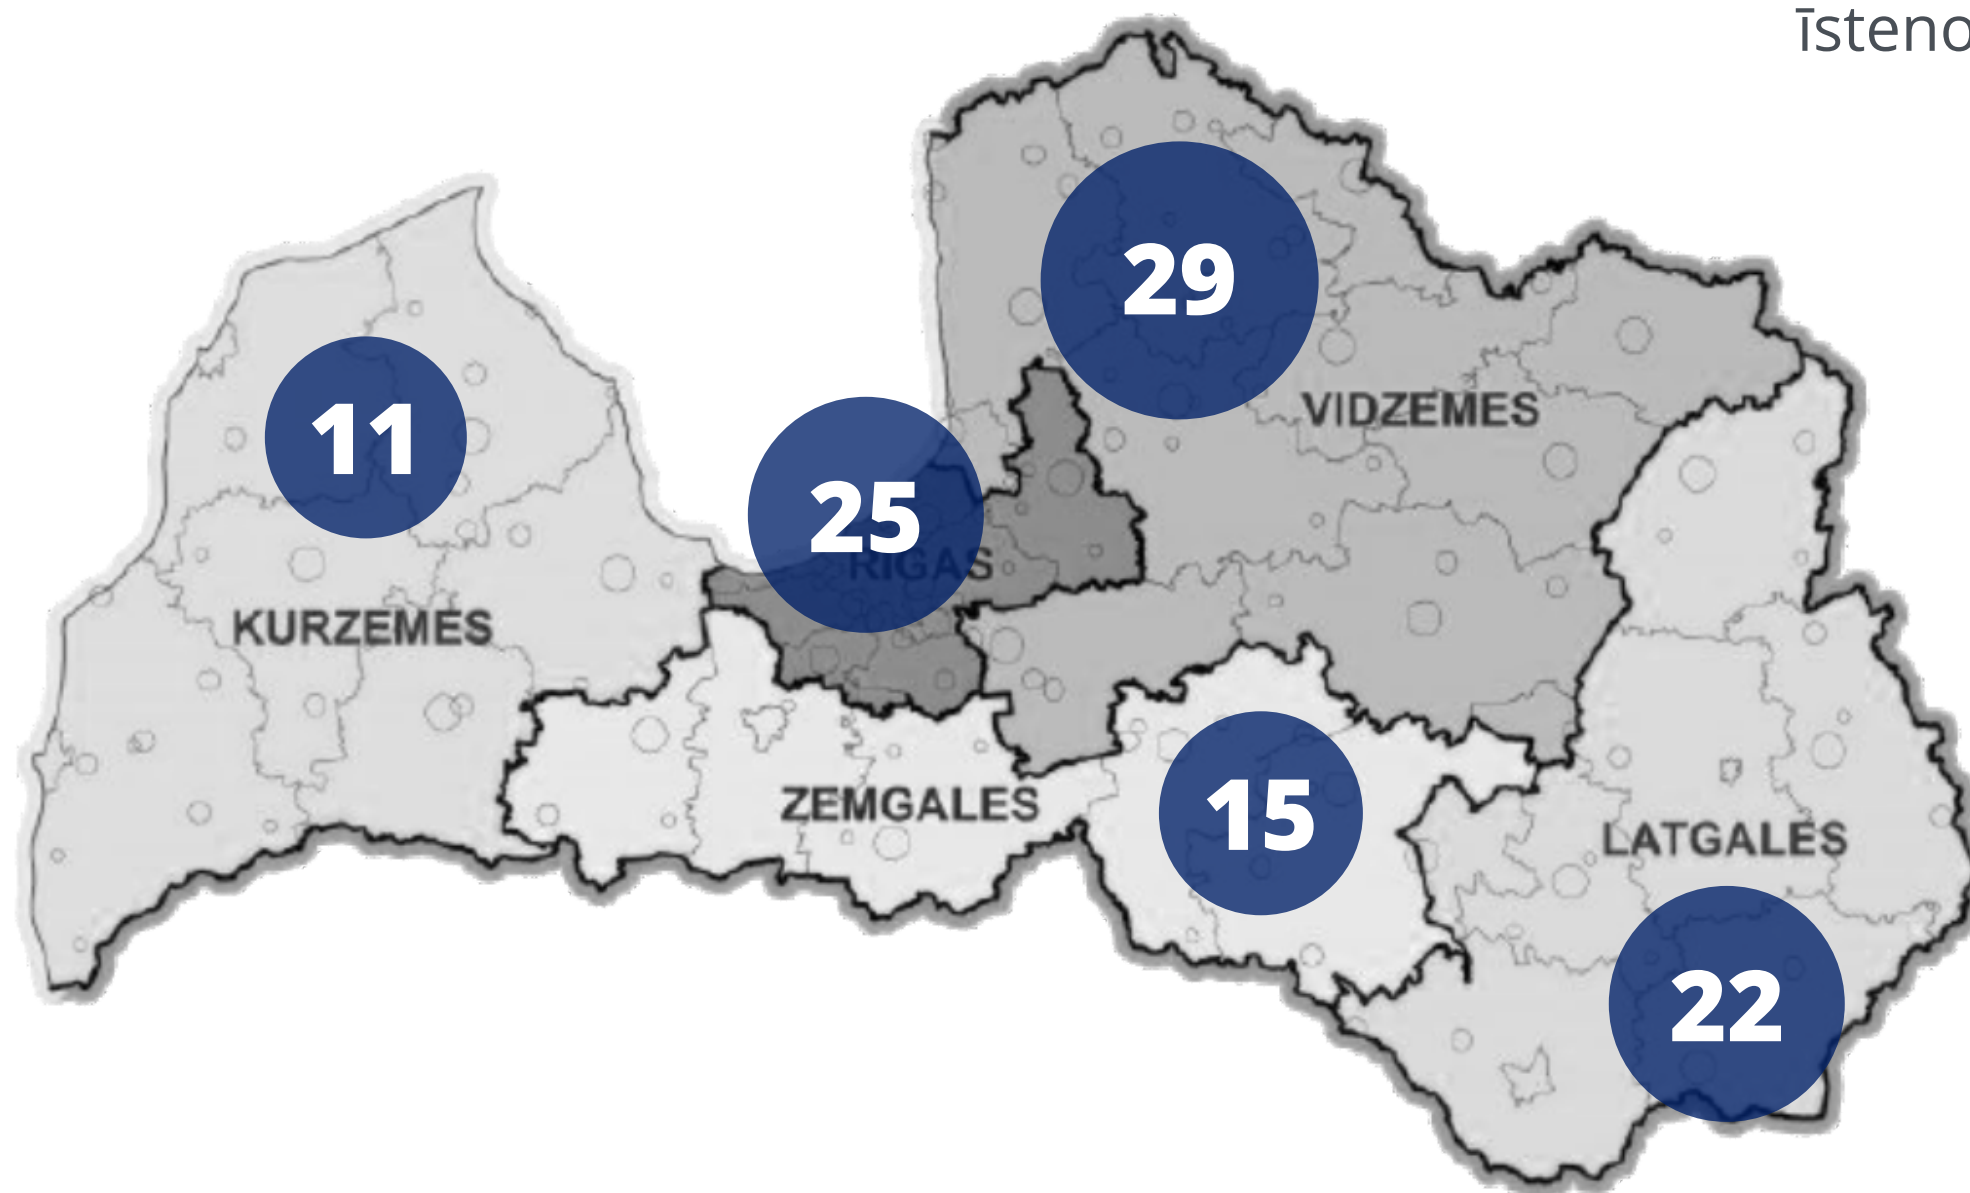

Projekti
īstenošanā

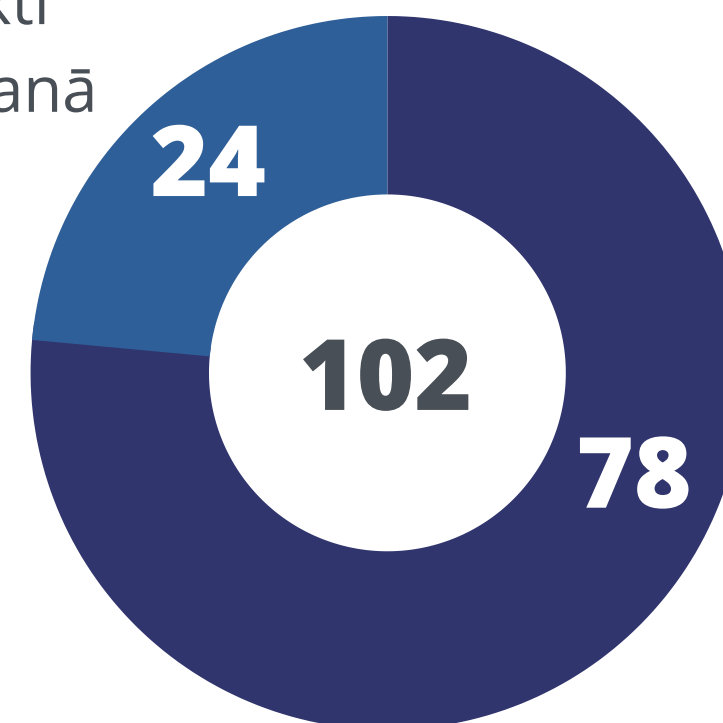

Pabeigtie
projekti

109,6
MILJ. €


**KOPĒJĀS
INVESTĪCIJAS**

T.SK. 58,9 MILJ. € ES FONDI



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI PAŠVALDĪBU ĒKĀS (4.2.2.)

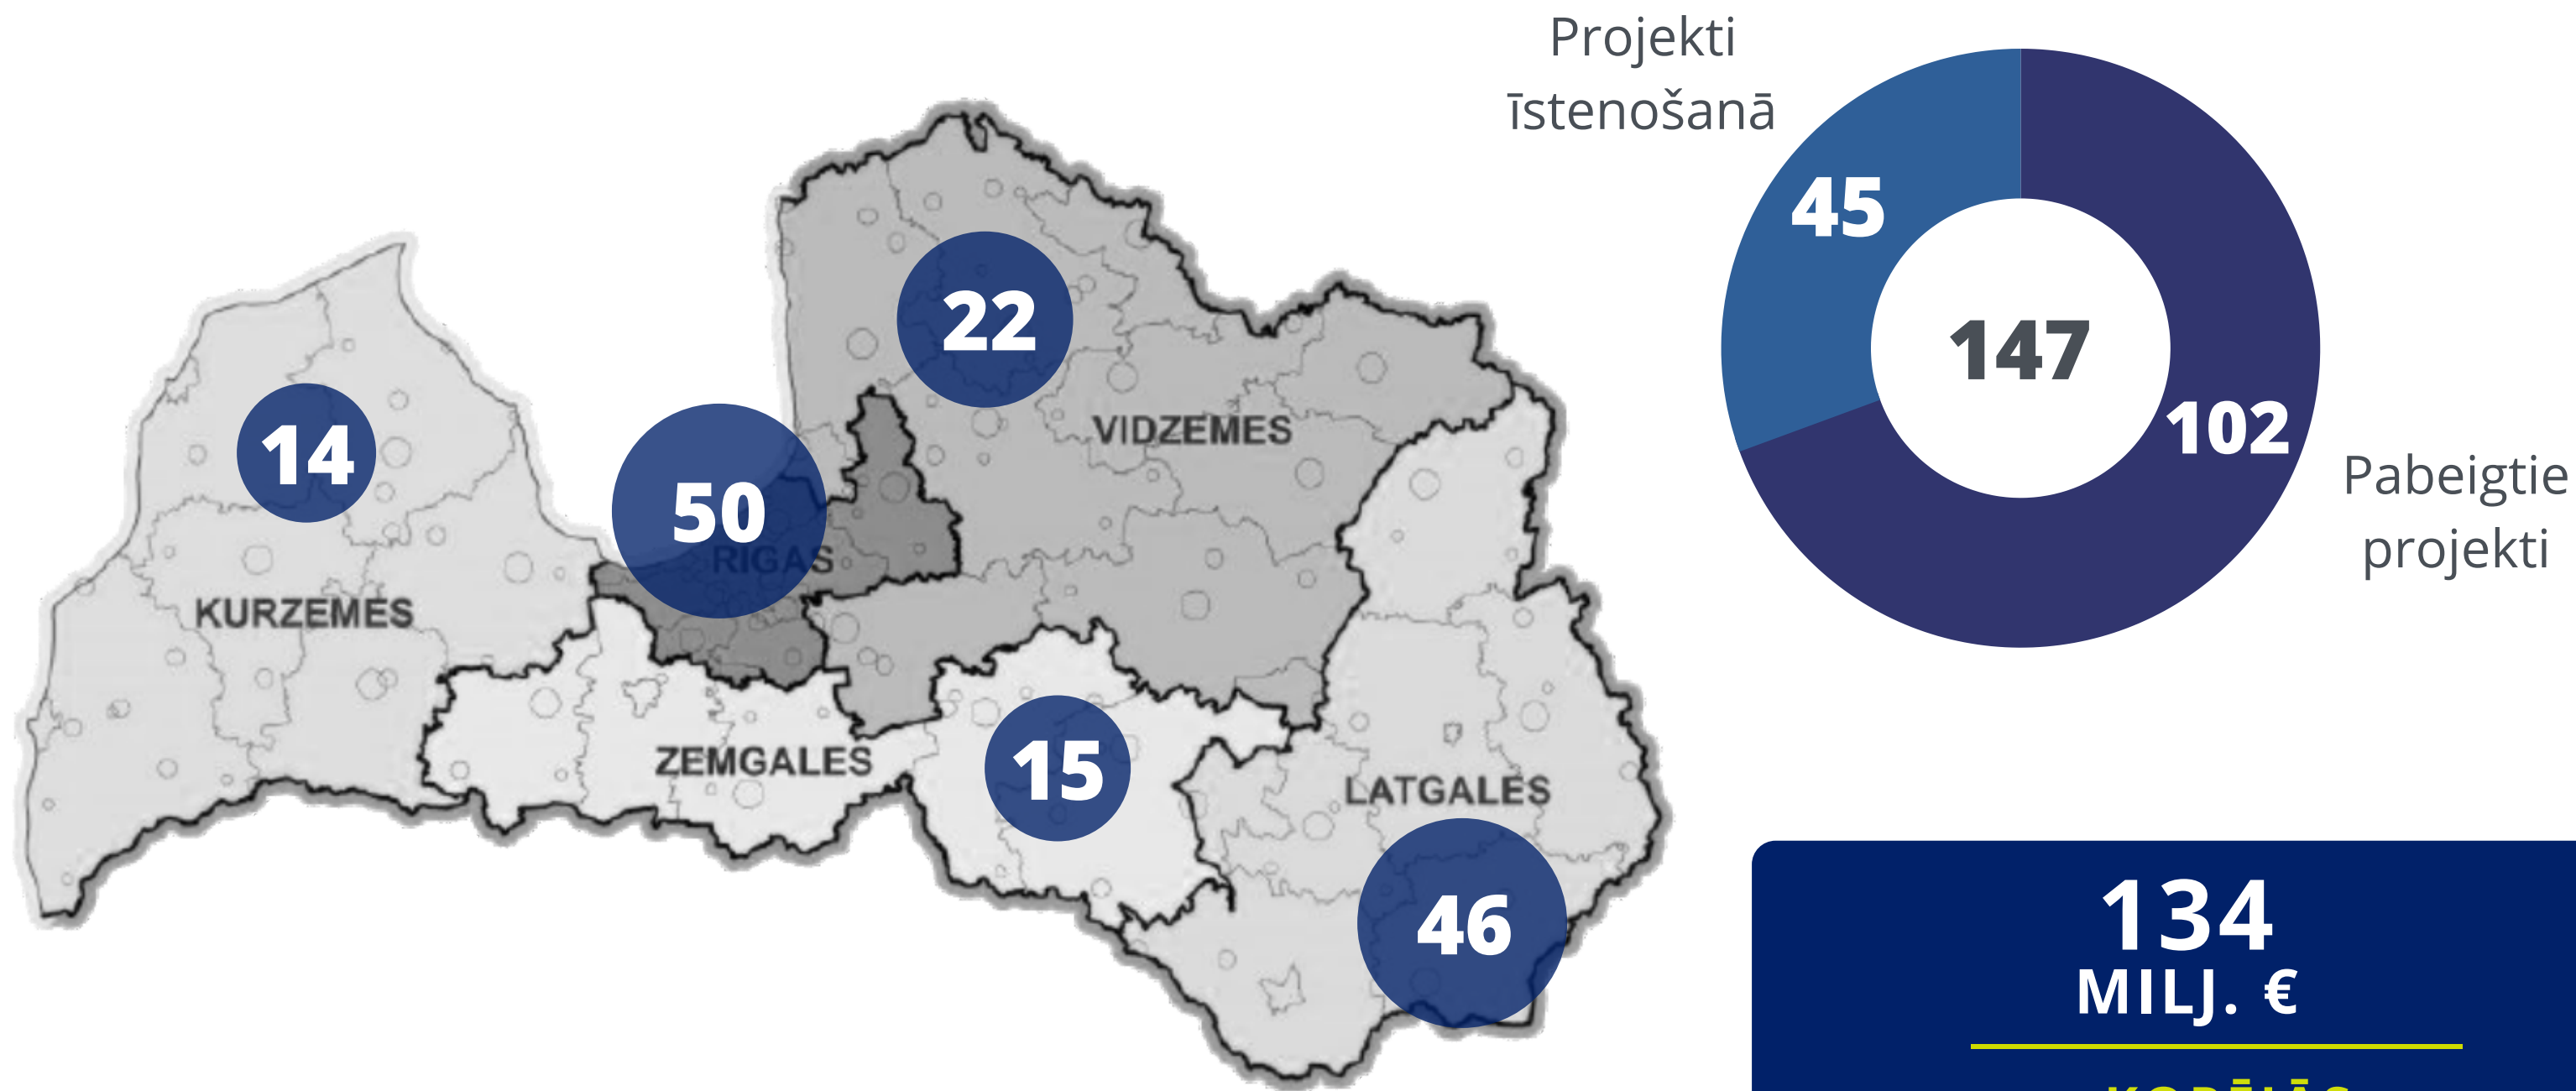

134
MILJ. €


**KOPĒJĀS
INVESTĪCIJAS**

T.SK. 46,5 MILJ. € ES FONDI




Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJAS PROJEKTI (5.6.2.)

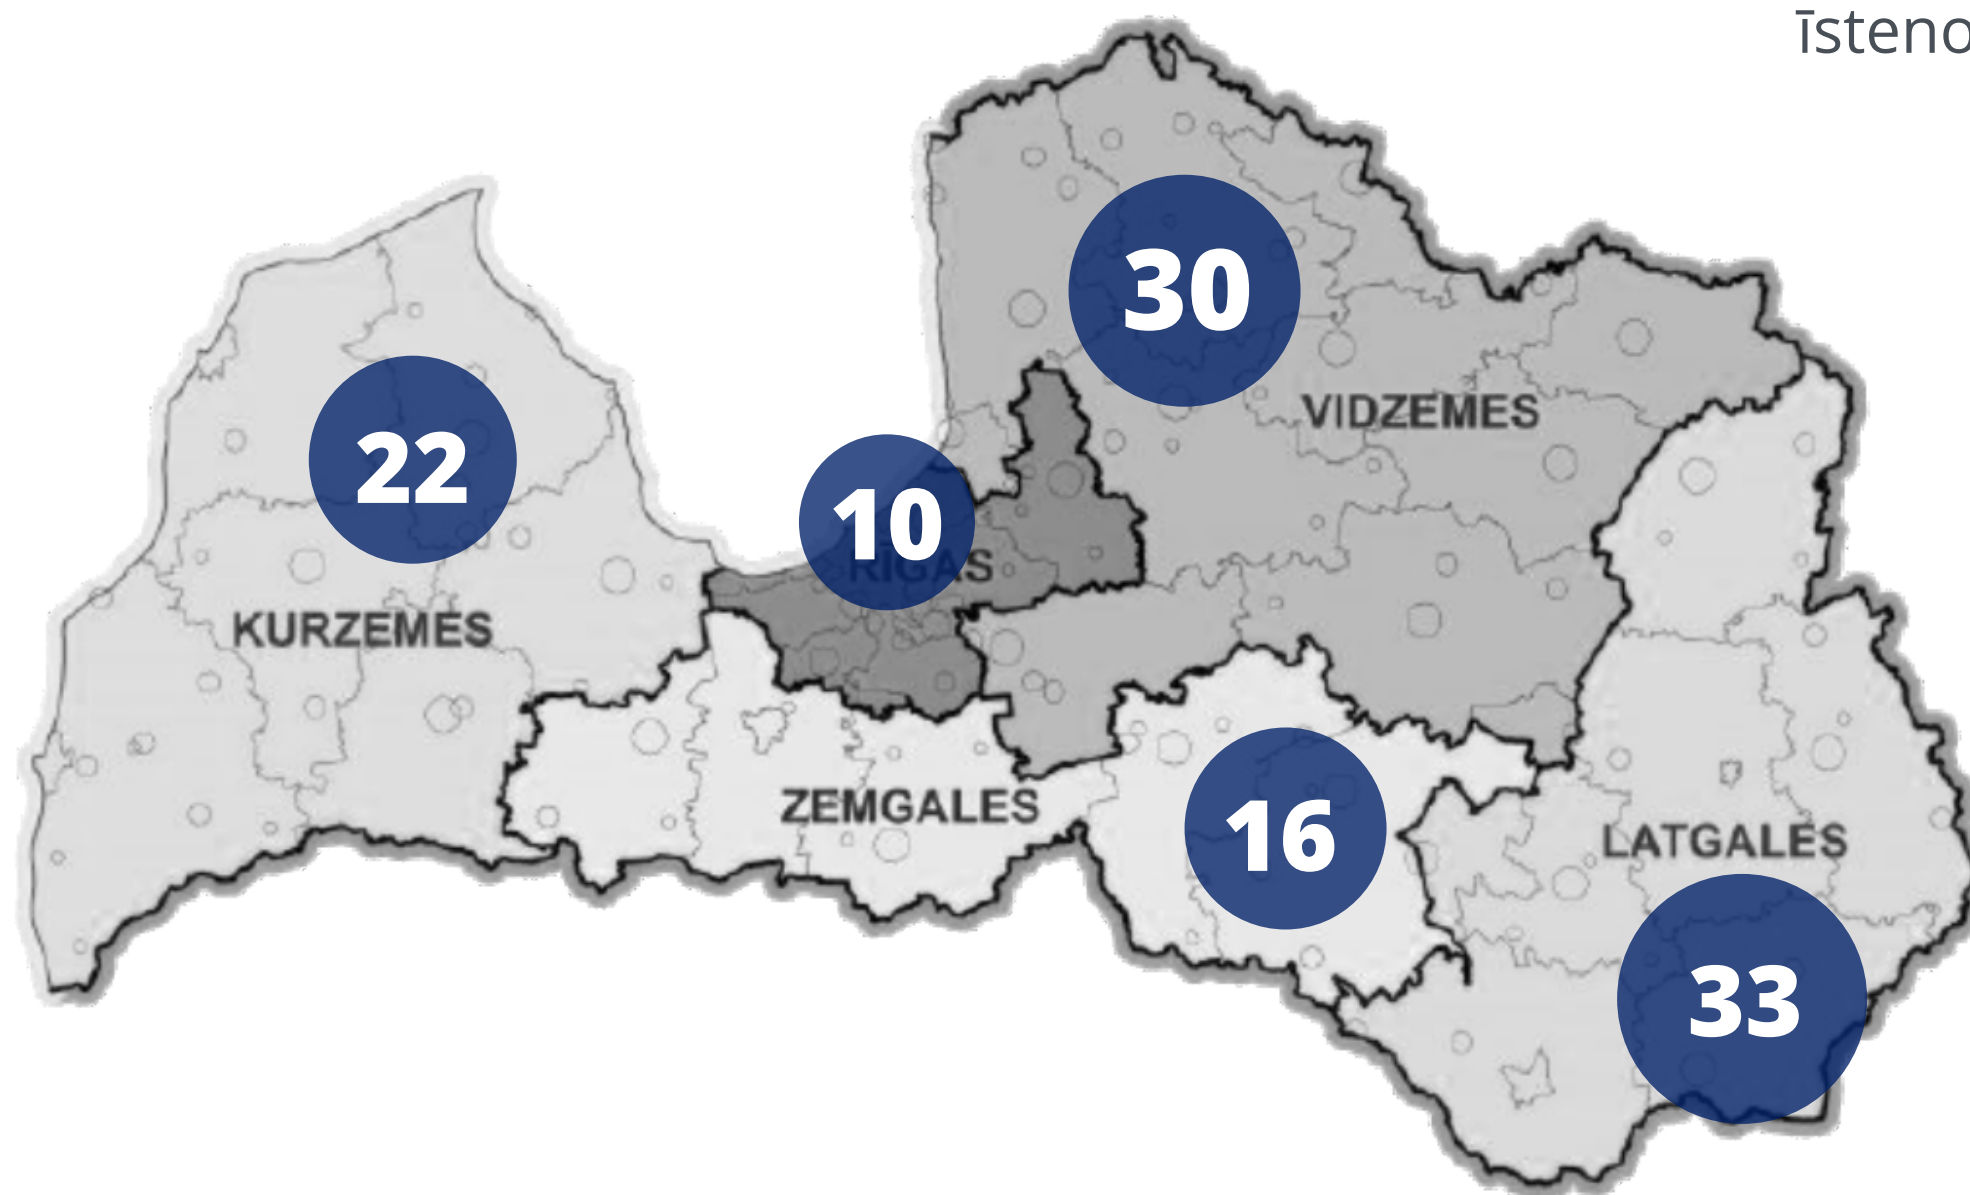

Projekti
īstenošanā

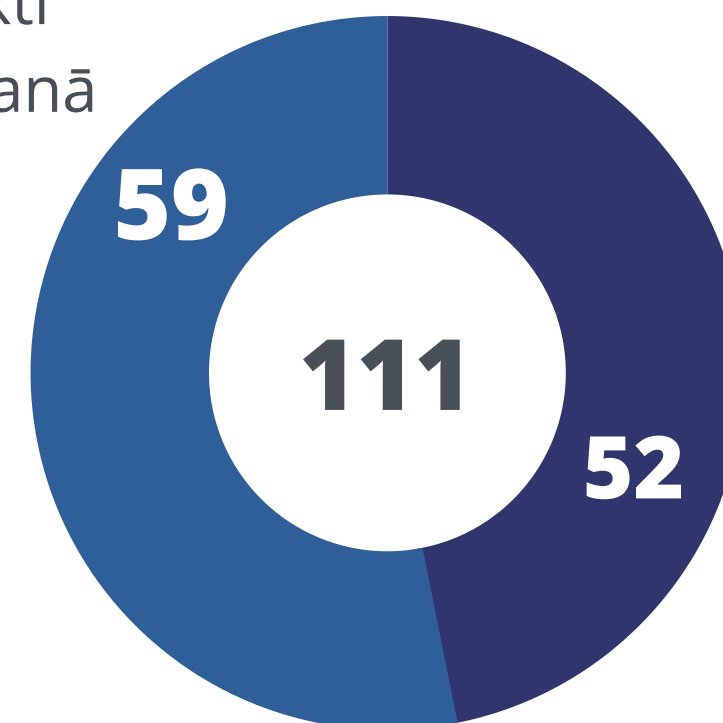

Pabeigtie
projekti

354,4
MILJ. €

**KOPĒJĀS
INVESTĪCIJAS**

T.SK. 221 MILJ. € ES FONDI



GALVENIE IZAICINĀJUMI PROJEKTU UZRAUDZĪBĀ



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA

- Iepirkumu **plānošanas** sasaiste ar projekta īstenošanas termiņu
- Nepamatoti sadalīti vai apvienoti iepirkumi
- Iepirkuma **procesā** iepirkuma regulējuma pārkāpumi
 - nesamērīgas prasības
 - neatbilstoša vērtēšana
 - nepamatoti/ neizsekojami lēmumi
 - interešu konflikta un krāpšanas pazīmju pārbaužu trūkums
- Līgumu **izpildes** laikā
 - Projekta vērtēšanas kritēriju sasaiste ar «zaļo» iepirkumu
 - Būtiskie līguma grozījumi





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

BŪVDARBI UN KVALITĀTE

- PVN attiecināmība projektos ar iznomājamo teritoriju
- Ieguldījumi privātīpašumā
- Būvdarbu izpildokumentācijas kvalitāte - nav izsekojami iebūvēto materiālu apjomi
- Nepamatota/ neatbilstoša materiālu nomaiņa
- Neatbilstoša speciālistu nomaiņa
- Būvdarbu izpildes kvalitāte
- Apdrošināšanas polises





Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

TRĪS «K» PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ



<https://www.cfla.gov.lv/lv/interesu-konflikta-noversana>




<https://www.cfla.gov.lv/lv/krapsanas-apkarosana>



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI (I)

- Valsts atbalsta veids un tā atbilstošā uzraudzība
- Projektos ar VA būtiski ir ievērot nosacījumus par:
 - izmaksu attiecināmības periodu (t.sk. būvdarbu uzsākšanu)
 - partneru/privātā finansējuma piesaisti
 - atbalsta intensitāti
 - dokumentācijas glabāšanas termiņu
- *De minimis* atbalsts
- Nomas tiesību izsoles

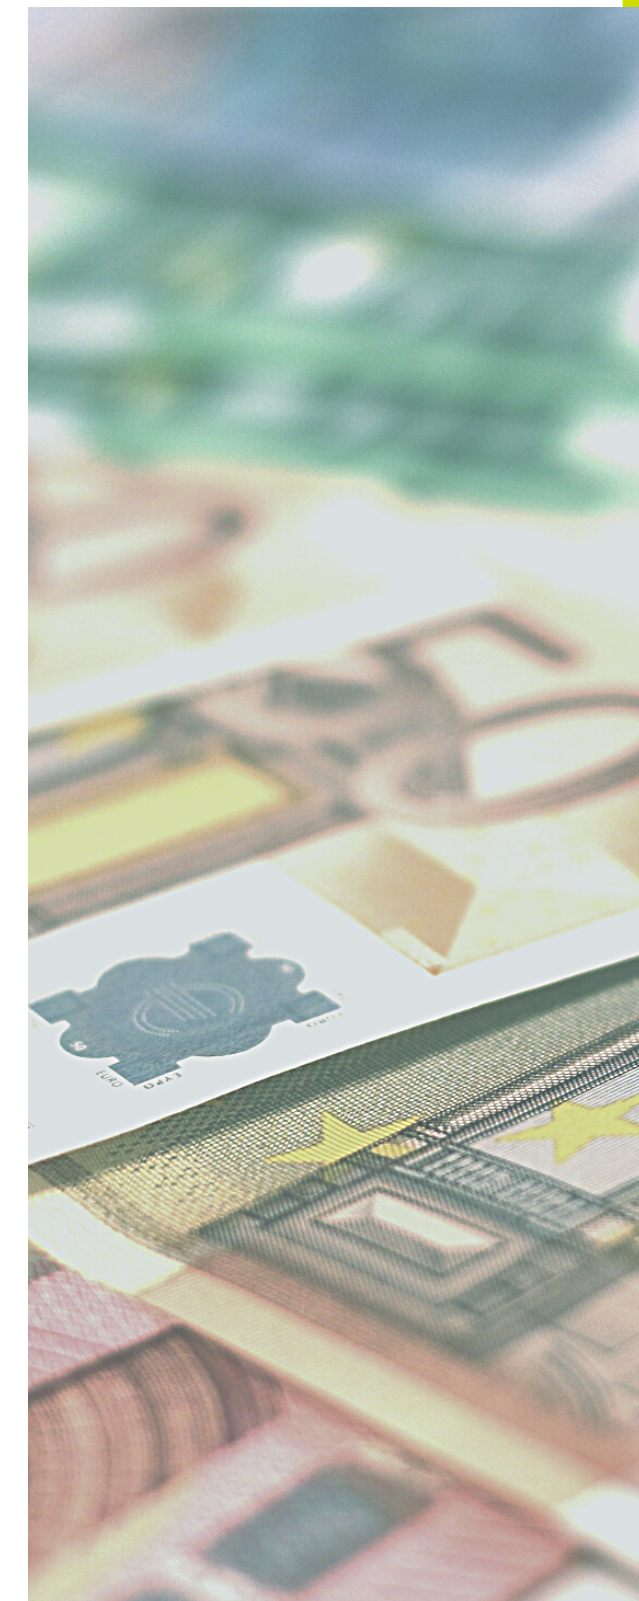




Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI (II)

- Izmaksu – ieguvumu analīzes (IIA) pārrēķins
- Pareiza projektā izveidoto pamatlīdzekļu nodošana
- Projekta pārskata perioda (dzīves cikla) uzraudzība
- Papildinošas saimnieciskas darbības (PSD) procentuālais ierobežojums projekta investīciju dzīves cikla laikā un papildpakalpojumu saturs

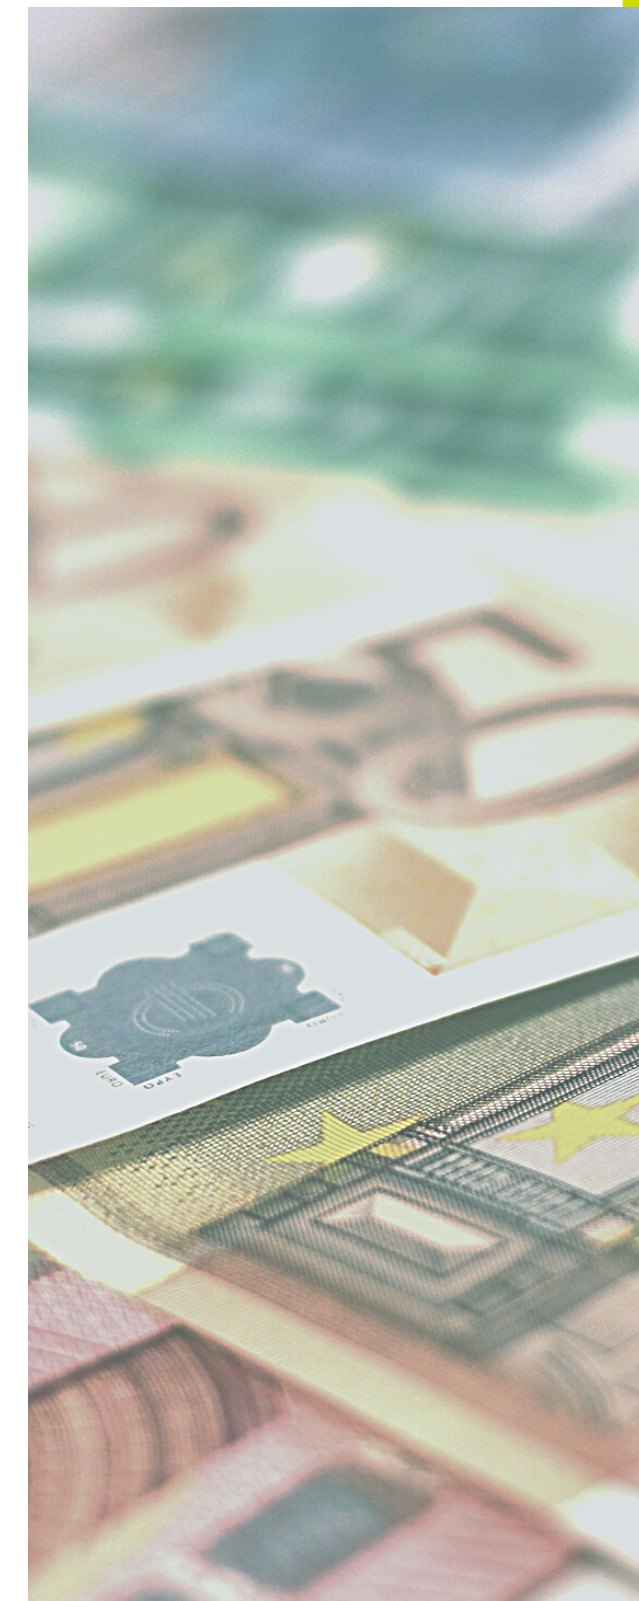



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANA



SVARĪGI!

Projekta īstenotājam ir **pienākums sasniegt projektā plānotos rādītājus**

Projektā sākotnēji plānotās **iznākumu rādītāju vērtības jāsasniedz obligāti**

Par katru **nesasniegto iznākumu rādītāju** tiek **piemērota atmaksājamās palīdzības formula**

KAS IETEKMĒ IZNĀKUMU RĀDĪTĀJU SASNIEGŠANU?

- Projektu plānošana un reālās situācijas neapzināšanās
- Uzņēmēju pārprofilēšanās, likvidācija
- Uzņēmēju intereses zaudēšana
- Nomas izsoles
- Covid – 19 ietekme uz kopējo uzņēmējdarbības vides attīstību






Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

PROJEKTU ĪSTENOŠANA

- **Naudas plūsmas plānošana** un faktiskā finansējumā vajadzība – finanšu disciplīnas risks
- Atbildīga **iepirkumu plānošana un veikšana** – laiks no iepirkumu izsludināšanas līdz būvdarbu līguma noslēgšanai – izpildes termiņa risks
- **Projektu vadības kapacitāte, pieredze, komanda** un piesaistīto konsultantu darba kvalitāte
- **Sadarbība ar iesaistītajām institūcijām** – CFLA, IUB – «konsultē vispirms» princips
- **Covid – 19 ietekme** uz projektu īstenošanu (skaidri izsekojama, pamatota, izvērtēta)

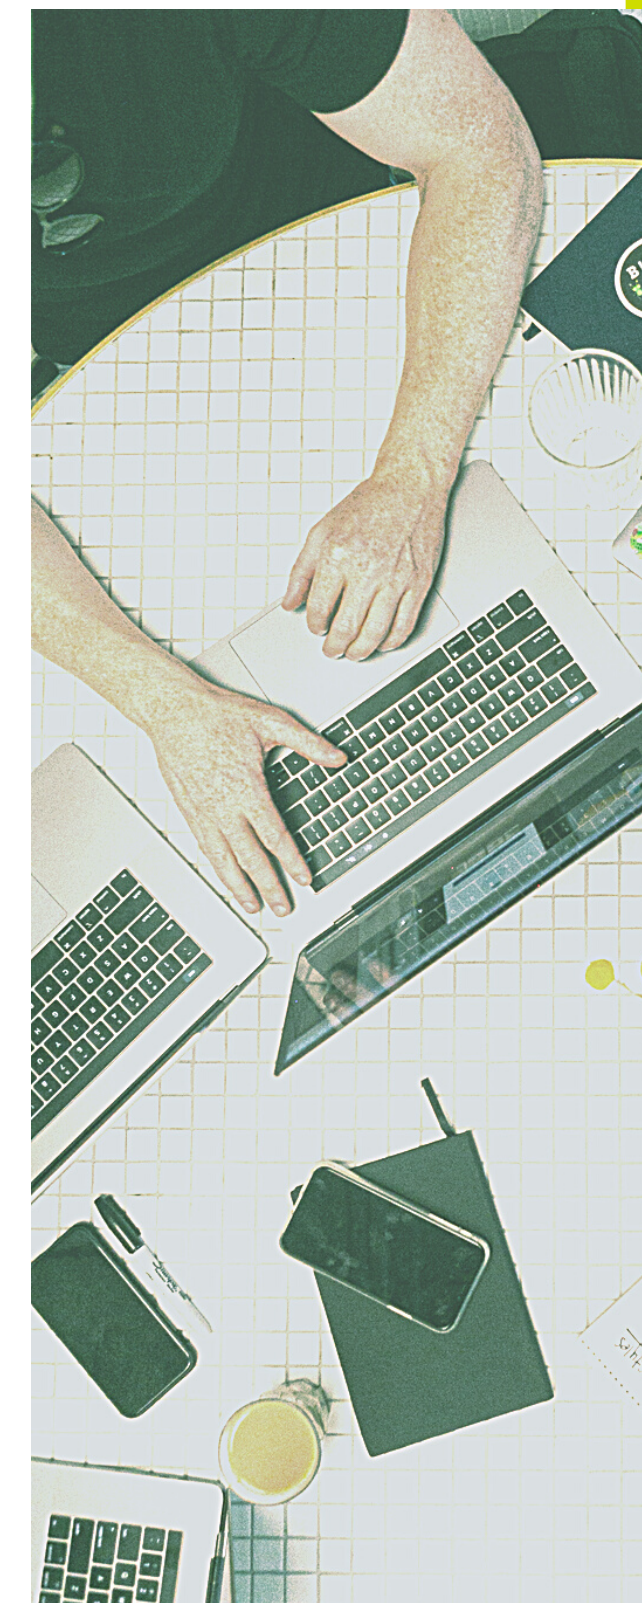



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

BIROJI

Rīga, Smilšu iela 1 | 66939777

Jelgava, Pasta iela 43 | 28445185 | zemgale@cfla.gov.lv

Kuldīga, Liepājas iela 48

Cēsis, Jāņa Poruka iela 8

Rēzekne, 18.novembra iela 35

E-PASTS

info@cfla.gov.lv


KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Rīga, Meistaru iela 10 | 66939777 | info@cfla.gov.lv



**Paldies par uzmanību un
veiksmi projektu īstenošanā!**

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
